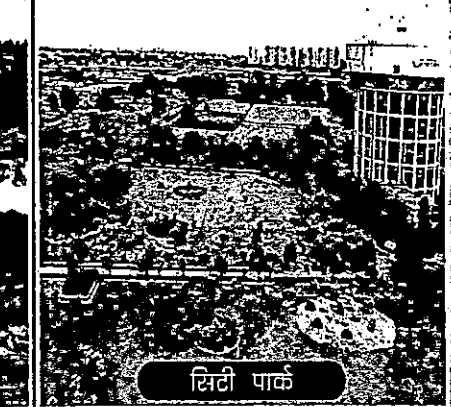
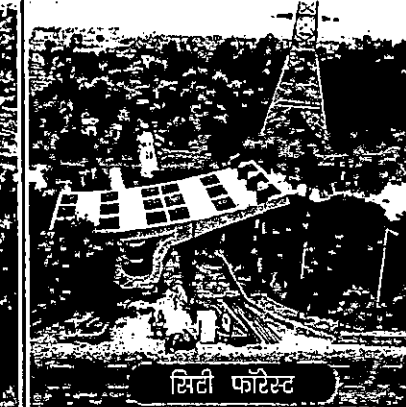
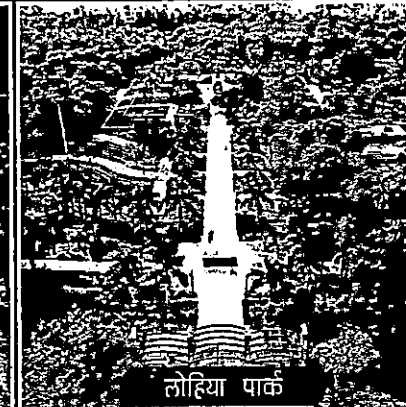
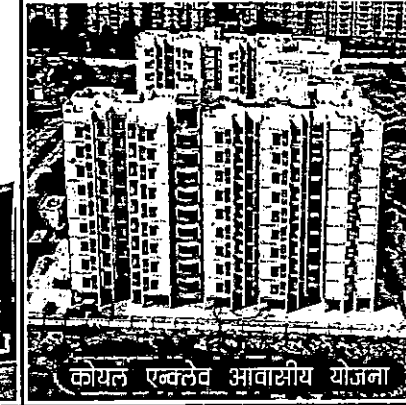
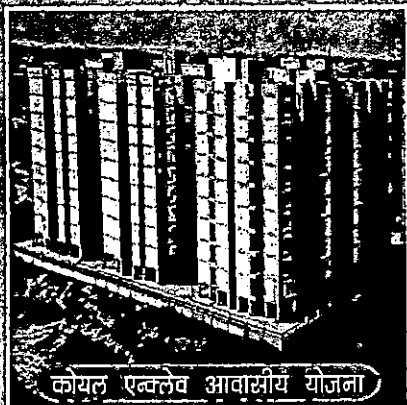




JULY/2020 MONTHLY PROGRESS REPORT

Ghaziabad Development Authority



हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्रांक: 424/4/पीओ(टी०)/2020-21

दिनांक : 14-08-2020

सेवा में,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ०प्र०,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र संख्या-5814/आ.ब.-1/निदेशक-2307/2020 दिनांक 04 अगस्त, 2020 के क्रम में नये प्रारूप-1 से 66 में मांगी गयी वांछित प्रगति आख्या माह जुलाई-2020 (डाउनलोड प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय



(संतोष कुमार राय)
सचिव

INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	अपर सचिव	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शंहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ में)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16	अपर सचिव	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानें + कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	लैण्ड बैंक	NF-20
20	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21	अपर सचिव	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	ग्रु-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय मूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाण पत्र' अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुए) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अवेध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रभारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	सहा०अभि०/अवर अभि० तकनीकी	रेन वाटर हारवैस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2020-21)	NF-37
37.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्वोरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुसंधान हेतु नगर निकायों को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46


क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
42	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43	अपर सचिव	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएँ (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2020-21 हेतु)	NF-50
45	"	Sustainable Development Goal-7 एवं मकान निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	"	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रक सेवाएँ/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी0ए0टी0पी0	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	विशेष कार्याधिकारी (एस0)	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयता सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	श्री अमरदीप कुमार, सहा0अभि0	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किरतें, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2020-21 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयता सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	विशेष कार्याधिकारी (एस0)	अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण	NF-62
56	"	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी0ए0टी0पी0/अधिशासी अभियन्ता (प्रमारी) जोन-3	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65
58	सी0ए0टी0पी0	शमन योजना 2020 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में	NF-66


वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2020 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2020 से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	67483	53593	53329	1288	13890	0	0	0	1288	0	256	0	0	67483	53849	53329	1288	13634


 (भगत सिंह)
 सहायक अभियन्ता
 (तकनीकी)


 मुख्य अभियन्ता
 माला प्रो
 010213



 संतोष कुमार राय
 सचिव


वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2020 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2020 से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12227	12528	48	1135	0	0	0	48	0	0	0	0	13362	12227	12528	48	1135


(मनोज सिंह)
सहायक अभियन्ता
(तयनांकी)


मुख्य अभियन्ता
प्रा. वि. प्रा. ०
ए. ०. ०. ०



अनूप कुमार सिंह
सचिव


वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2020...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2020 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2020 से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12717	10531	11193	440	2186	0	0	0	440	0	0	296	0	12717	10531	11489	144	2186


(अनंत सिंह)
सहायक अभियन्ता
(सकनीकी)


सहायक अभियन्ता
गोवादास
11.08.20


अनंत कुमार राठ
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2020 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2020 से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8761	9061	0	3271	0	0	0	0	0	0	0	0	12032	8761	9061	0	3271

Bama
(भगत सिंह)
सहायक अभियन्ता
(एकेनो-सी)

[Signature]
07.08.2020
07.08.2020
07.08.2020

[Signature]
संतोष कुमार
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2020 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	2785	0	0	0	0

Ad
जे.ए.
वे.के.
जे.ए.
जे.ए.

आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

संतोष कुमार राव
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2020 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	1288	0	0	0	0

Bramy
(भगत सिंह)
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)

R
मुख्य अभियन्ता
शा.नि.प्रा.
गा.बाद

Q
छांटोप कुमार सिंह
सचिव


प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2020...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020


क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु)(भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+13*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	36000	0	22.2339	0	10.195	0	2352	0	8956	0	7354	21508	14492	60.00


आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक








संतोष कुमार राय
सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12


रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्रम सं.	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	12	0	12	0	7354	0	12	0	6	0	2785	0	2785


AM
JTB

Nov.
20

Chh
PB



आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक


आशीष कुमार शर्मा
सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	1.04.2020 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

M

संयोजक
/ कवर ऑफिस

[Signature]

संयोजक कृष्ण राव
- सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	1.04.2020 को सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

AA
JIB
WE
OC
AM
AE

Q

आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

संतोष कुमार राव
साथ

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: July, 2020.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण					भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)	अनावंटित रखने का कारण
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कच्चा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कच्चा प्रदत्त			
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1332	100	3474.43	सभी भवनों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है

ब्राम
 दि. 07/08/2020
 अधिकारी अभियन्ता
 म.प्र. आवास

प. र.
 कच्चा अधिग्रहण
 दि. 07/08/2020
 अधिकारी अभियन्ता
 म.प्र. आवास

रंजीत कुमार राय
 दि. 07/08/2020

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कॉलम 10 + पिछले माह का कॉलम 11

रिपोर्टिंग माह: July, 2020 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रिआ में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूँजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़) (10+11*)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	UPRERAPRM5538	21/05/2005	10/07/2009	4494.31	2866.99	202.17	0.00	186.843	3490.00	10	26811	1019.22	1019.22	31/07/2014	0.00	2761.72
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	UPRERAPRM7375	21/05/2005	05/11/2011	4312.99	671.00	309.69	0.00	180.091	827.65	9	21580	373.43	0	30/06/2016	0.00	912.50

राजीव शर्मा
मुख्य निरीक्षक

आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर निरीक्षक

संजय कुमार राव
साक्षि

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आवादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आवादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लॉड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मिसे गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIG के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति	आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल				
								क्षेत्रफल	भौतिक															दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	50	39	50	50	43	593	28	10	8	10	15	2120	13137	13137	8330	8330	288	0	972	1178	576	500	387.15	0	5336
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	11	6	9	9	6	671	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0	144

du \$ sa

आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक


शिवपुरी कुमार राव
सचिव

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1


उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020


क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29/05/2006	03/02/2007	360.00	257.58	29.40	9.25	316.00	0	0	0	0	12/10/2013	0.00	1258.00
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ5463 & OTHER	29/05/2006	09/05/2007	140.63	114.08	15.62	0	137.00	0	0	0	0	14/09/2015	0.00	364.63
		मैसर्स अग्रवाल एसो प्रमोटर्स लि0	UPREARPRJ1498 & OTHER	29/05/2006	07/05/2007	185.00	184.69	8.64	8.63	18.69	0	0	0	0	07/10/2013	0.00	386.71
		मैसर्स एम्मार एम0 जी0 एंफ्र0 लैंड लि	UPREARPRJ3055 & OTHER	12/09/2008	13/10/2013	117.68	75.00	0.46	0.2496	75.00	2	0	0	0	12/10/2013	0.00	216.41
		मैसर्स एस0 एम0 वी0 एंजेसीज प्रा0 लि0	UPREARPRJ5719 & OTHER	29/05/2006	13/02/2007	300.00	186.65	3.48	0	226.50	0	0	0	0	30/09/2011	0.00	452.00
		मैसर्स सामग कंस0 लि0	UPREARPRJ3882 & OTHER	29/05/2006	23/02/2007	72.90	68.88	0.41	0	72.90	0	0	0	0	27/11/2015	0.00	387.00
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा0 लि0	UPREARPRJ5633 & OTHER	29/11/2006	22/10/2007	91.60	67.69	5.66	0.3158	79.75	0	0	0	0	12/10/2013	0.00	428.00
		मैसर्स साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0		0	0	200.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	90.00	

राजीव रतन शंख
मुख्य निरीक्षक



आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक



इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: July, 2020.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोइल-स्टॉन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लॉड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मिंग गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति		आवंटित		बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल			
																		क्षेत्रफल	भौतिक	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग			दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	63	63	63	63	50	38.58	13	0	0	0	0	0	2214	2214	1575	1575	496	466	0	0	496	466	0	0	14700	
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	392	392	318	318	128	32	128	176	256	160	0	0	951	
		मैसर्स अप्रवाल एसो प्रमोटर्स लि0	95	95	95	95	100	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	152	128	36	112	152	240	0	0	2542	
		मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	62	47	57	57	48	17.10	1	0	0	0	0	0	450	450	270	270	0	0	244	272	244	272	0	0	2100	
		मैसर्स साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0	65	83	65	65	65	1.43	0	0	0	0	0	0	303	303	224	224	71	24	153	92	152	32	0	0	1870	
		मैसर्स एम्मार एम0 जी0 एंफो लैंड लि	70	80	85	85	90	10.38	3	0	0	0	0	0	593	593	363	363	24	24	110	110	0	0	0	0	1093	
		मैसर्स सामग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.50	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	0	0	360	360	306	259	0	0	494	

2 3 20

राजीव रतन शर्मा
नगर निवेशक

आशीष शिवपुरी
नगर निवेशक

कुमार तारु
नगर निवेशक

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2020 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चातू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (₹0 लाख में) (क्रमिक योग)
							संख्या(7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (₹0 लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	20	0	0	20	1	1	26.24	19	554.70

Mu
मनोज कुमार सागर
प्रशासक अनियन्ता
स्वायत्त

सीएच पीए विभागी
अवर सचिव


मनोज कुमार सागर
प्रशासक अनियन्ता
स्वायत्त


सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकान + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2020 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में)
							संख्या (7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	268	0	219	487	14	24	4463.65	463	96271.44
1	Ghaziabad	268	0	219	487	14	24	4463.65	463	96271.44



मनोज कुमार सागर
सहायक अभियन्ता
व्यवसायिक



सी.के. त्रिपाठी
अपर सचिव



मनोज कुमार सागर
सहायक अभियन्ता

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	रिपोर्टिंग माह: July, 2020.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है						
		प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ghaziabad	5014	5014	7925	7925	62	13001	140	130.99	


मनोज कुमार सागर
सहायक अभियन्ता
मिड


सी० पी० त्रिपाठी
अवर सचिव


मनोज कुमार सागर
मिड

लैण्ड बैंक


उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14


रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2020 की स्थिति							वर्ष 2020-21 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)								अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित(हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर)	नियोजन हेतु उगलव्य कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	3889.92	3719.70	3633.60	3167.78	2099.88	1950.06	86.10	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	170.22	86.10	542.62	



उदय नारायण
अमीन


अनवरुल हाक़
अमीन




अनवरुल हाक़
अमीन

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/ सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00
		सद्दीकनगर ख0 सं0 1013 , 1014	208.00	राज नगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0.00

(अनवर प्रताप)
अधीक्षक

(अनन्द चण्ड (6722) म)
अधीक्षक

(अनवर प्रताप)
अधीक्षक

(सुरील कुमार चौधरी)
विशेष प्राधिकारी

(सुरील कुमार चौधरी)
विशेष प्राधिकारी

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2020 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	374	174	548	60	85	0	85	463	nil

रवि शंकर शर्मा
उप-सचिव


शंतीव कुमार राय
सचिव


आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2020 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020 लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	14	1	8	22	1	12	10	0	0	0	0	nil


नोट:- उक्त सूचना आन लाईन की नटि है।



 C.C.



 C.C.


 C.C.


 C.C.


 राजीव रतन शर्मा
 नगर नियोजक


 मुख्य नगर नियोजक


 धीरेंद्र कुमार राय
 सचिव


अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 5


रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2020 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	11	0	4	15	1	6	8	1	0	0	0	nil


नोट! उक्त सूचना आन लाईन की जाई है




 C.C.



 राजीव रतन शर्मा



 आशीष कुमार शर्मा



 आशीष कुमार शर्मा

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2020 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0nil

नोट - उक्त सूचना आन लाइन की जाई है।

cc 2/1/2020

cc cc cc cc cc

शशि देव

मुख्य निरीक्षक

आशीष शिवपुरी

मुख्य नगर नियोजक

अशोक कुमार राय

अचिव

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2020 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित	
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक		
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट: उक्त (रुचना आर्क लाईन) की नकल है।

CC

2.14.11

राजीव शर्मा
मुख्य नियोजकआशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजकअमित कुमार शर्मा
अचिद


अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 10/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31.03.2020 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	272	57	130	402	2	37	365




अधीक्षक शिबपुरी
मुख्य नगर निरीक्षण क


संतोष कुमार राय
सचिव

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 31.03.2020 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2020 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2020 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1904	182	1722	1	2	1724	0	3	1721

(सुशील कुमार चौधरी)
विशेष सहायक अधिकारी

संतोष कुमार राय
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 9

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	31.03.2020 को संचित धनराशि (रू.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*)	पिछले वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	752.17	41988.00	0.00	0.00	42740.17	3324.49	6818.94	14139.13	48.23	2326.76	34.12

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

अंशु कुमार राय
सचिव

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2020 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रु० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां (रु० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रु० लाख)		शमन (रु० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा वेटरमेंट चार्जज (रु० लाख)		अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)		कुल अर्जित आय (रु० लाख)		
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	18375.00	93183.00	3810.02	1844.68	2638.42	315.38	0.00	0.00	31/12/2016	0.00	0.00	3209.14	1678.26	4481.55	2980.62		14139.13	6818.94

निदेशक
आवास एवं विकास प्राधिकरण
भारत सरकार

रतन कुमार राय
साक्षर

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कैलम 13+पिछले माह का कैलम 14

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2020 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	44630.46	31.12.2016	0	0	157.69	1678.26	0	1835.95	46466.41	34771.00	8.11	483.23	11695.410000000003

महानगर विकास प्राधिकरण
गाज़ियाबाद


अध्यक्ष
गाज़ियाबाद


निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 में वजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*)	वजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	30000.00	931.21	2433.67	8.11


 .द.र.क.
 अधिकारी, विकास प्राविधान
 गाजियाबाद


 अंतोष कुमार शर्मा
 सचिव

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॉलम 11+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के बाद रजिस्ट्रों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2020 तक चिह्नित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2020 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिह्नित नये अवैध निर्माण	कुल चिह्नित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	12005	3870	177	8312	17	37	42	91	15	16	0	8259	17/17/25.05.17 20/17/20.06.2017 48 /17 12 .01 .2018	13.06.17 05 .05 .17 29 .01 .18

(सुशील कुमार चौबे)
विशेष कार्याधिकारी

सतोष कुमार राव
सचिव

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कालम 5+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अधिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली विहित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अधिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अधिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अधिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7+8*)	अधिकरण के गठन से दि. 31.03.2020 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	147	0	141	0	26	72.06	0.00	0.00	0.00

Banq
(संगत सिंह)
सहायक अभियन्ता
(नगरपालिका)

R
मुख्य अभियन्ता
दि. 12.08.20
2020

संतोष कुमार राय
साथक

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0व0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)					चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/ व्यय घनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)	
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग		अनुमोदित (संख्या)	निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित (संख्या) (9+10)	कार्यवाही स्तर		आलोच्य माह तक प्राप्त (रू. लाख)	आलोच्य माह तक व्यय (रू. लाख)	प्रारम्भ कालोनिया संख्या	पूर्ण कालोनिया संख्या		
				विना (संख्या)	सहित (संख्या)	5+6					प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nil

(सुशील कुमार चौबे)
विशेष कार्याधिकारी

सुशील कुमार चौबे
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण की प्रगति

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			<08 फुट (उंचाई)	≥ 08 फुट (उंचाई)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	117000	117000	0	117000	100.00

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020

Dr. Shakti
6/8/2020
शक्ति कुमार भास्कर
(सहायक संयोजक अधिकारी)

Dr. Chandhy
6-8-2020
एन.के. चौधरी
अधीन अधिकारी

Dr. Anoop Kumar
अनूप कुमार राय
अधीन अधिकारी

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2020-21)

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Ghaziabad	0	0	0	0	4	6	0.00	0.00	2	4879.63	2359.20	2	17.74	34659.39

Boomy
मिगत सिंह
सहायक अभियन्ता
(टि.सी.डी)

1 R
मुख्य अभियन्ता
प्रा.नि.प्रा.
ग.वा.ड

कुमार राय
अभियन्ता

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)						रिपोर्टिंग माह: July, 2020.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020		
		हाइटैक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्पूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा0 मुख्य मंत्री संदर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	8	11	10	0	3	0	16	225	0

कोलम नं० ३ सतमापन
 (निलय/एलएई)
 (नगरपालिका)

(सुशील कुमा, जेडी
 विज्ञान सहायक निरीक्षक)

(सुशील कुमा, जेडी
 विज्ञान सहायक निरीक्षक)


(सुशील कुमा, जेडी
 विज्ञान सहायक निरीक्षक)


(सुशील कुमा, जेडी
 विज्ञान सहायक निरीक्षक)


प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	वियत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	2	0	0	1	0	1


 10/8/20
 10-8-2020
 cc.


 OSD S
 10-2-2020
 (सुशील कुमार चौबे)
 विशेष कार्यधिकारी


 सुशील कुमार चौबे
 अधिकारी

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)	दाखिल रिज्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	38	910	1	40	989.00	38	845	1	40	924.00	74	74	4	4	118	141

Handwritten signature

Handwritten signature
 LA
 (सुनील कुमार)
 विशेष कार्यकारी

Handwritten signature
 DSDGDD
 (सुनील कुमार जी)
 विशेष कार्यकारी

Handwritten signature

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्नेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/ निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	अनिल कुमार सिंह	12	पूर्ण हो चुकी है	0	माह अप्रैल 2017 से लागू	0	पूर्ण हो चुकी है	हां	0

Boony
 07/08/2020
 11:30 AM

R
 07/08/2020
 11:30 AM

Boony
 07/08/2020
 11:30 AM

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2020 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2020 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	22	0	0	0	7

Bramy
 29/08/2020
 22/08/2020
 0/08/2020

R
 मुख्य अभियन्ता
 शा.बि.प्रा.
 गा.बि.प्रा.

संवेक कुमार शर्मा

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रू० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू० करोड़ में)
			माह में व्यय (रू० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	0.00	9.31	24.34	3.65

Boomy
(भगत सिंह)
सहायक अभियन्ता
(संरचनाई)

[Signature]
मुख्य अभियन्ता
Ghaziabad

[Signature]
सहायक अभियन्ता
संरचनाई

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 10/08/2020

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	मान्य उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया	0	0
		वैशाली	एल0 आई0 जी0	52	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना कोड 841	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन - 5 सी	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन -5 डी	72	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-88	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	ई0डब्लू0 एस0	29.7	08.03.2010	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	धनराशि जमा न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	ई-52	90	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम आई जी	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस - 758-41 डी	29.7	08.03.2010	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-107	60	30.08.2007	धनराशि जमा न होने के कारण धनराशि जमा न होने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	01.8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2098 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	जे -133 प्लॉट	83.66	30.02.2014	दिनांक 24 -08 -94 को कब्जा दिया	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-29 प्लॉट	162	01.04.2006	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		संजय नगर	एल आई जी	22	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	31.12.2009 रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		वैशाली	एम् आई जी 8 भवन	28.56	22.11.2011	अनुबंध विलख किया जाना है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349.86	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	111.57	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस - 772-41 डी	29.7	28.11.2011	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3	एम् आई जी	82.107	02.09.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/878 प्लॉट	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		न्यायखंड -3 57	एम् आई जी भवन न0 नहीं है	39	21.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एच आई जी भवन न0 नहीं दिया है	111.52	24.06.2014	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	06.08.2015	दिनांक 14 -06 -2011 को नोटिस	0	0
		वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मधुबन बापूधाम योजना में अनुबंध विलेख/कब्जा चल रहा है	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई0 डब्लू0 एस0	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/523	90	10.02.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	ई0डब्लू0 एस0	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख होने दस लिए गतिमान है	0	0
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम0 आई0 जी0	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-33	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	0	0
		प्रताप विहार	के ए- 380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	1/आर - 07	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 35	ई डब्लू एस	19.5	15.01.1990	धनराशि जमा करने के कारण	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

सी० पी० त्रिपाठी
महोदय

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम	ज्ञानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए, 182, 183	69.33	21.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90	23.07.2007	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		गोविन्दपुरम जी ब्लॉक संजय नगर	एम0 आई0 जी0	89.96	29.03.1989	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
			एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	4/5/2009	प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0
		राजेंदर नगर	ई0डब्लू0 एस0	35.6	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/453	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वेशाली	ई0डब्लू0 एस0	28.56	22.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		पटेल नगर	आवासीय भूखंड	170	02.05.1985	अतिक्रमण के कारण स्थगन आदेश प्राप्त है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-48	90	30.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -3/100 एच आई 0 जी0	60	21.04.2007	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		नेहरू नगर थर्ड	एन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/582	1582	02.06.1990	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम0आई 0जी0	47.23	16-09-2015	निर्माणाधीन	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/887	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-67	60	30.08.2007	दिनांक 15-09-2018 को बकाया धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	90	10.03.2005	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		कोशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एंन -69/4	209.83	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	के-78	83.63	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	ई0डब्लू0 एस0	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ	मिनी एंम0 आई0 जी0	47.23	16.09.2015	निर्माणधीन	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77,158,192सी	एम् आई जी	77	13.12.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		कोशाम्बी	ऐ - 245	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एल0 आई0 जी0	28.9	20.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/314	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/837सी	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना कोड 841	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.7	14.07.2015	इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना 841 -41 डी के कुल भवन - 896 25 निरस्त 335 आय प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण निरस्त बाकि पत्रावली के अनुबंध विलेख उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/210	352.8	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापुधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वेशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	111.56	15.09.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		कोशाम्बी	आवासीय 1405 भवन	113.84	17-जन	रजिस्ट्री न कराये के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-77	60	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		कोयल एन्कलेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई -72	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इन्द्राकुञ्ज	ई डब्लू एस	18.63	30.06.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/591	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एम् आई जी	39	21.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 70	इंद्रापुरम भवन - 70	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		वैशाली	वैशाली	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	30.11.2013	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	47.23	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	मिनी एम् आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		कोयल एन्कलेव योजना	1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन प्लेट शेडल जारी	0	0
		कोयल एन्कलेव योजना	2 बी एच के	790	27.09.2016	निर्माणाधीन प्लेट शेडल जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	वैशाली	375	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक इंद्रापुरम	एम् आई जी एन के -2/888	89.96 19.5	29.03.1989 02.01.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण धनराशि जमा करने के कारण	0 0	0 0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	345.4	07.10.1985	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/766	345.4	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

सी0 पी0 त्रिपाठी
अपर सचिव

संतोष कुमार
सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग


रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति


स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2020-21 हेतु)


उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	भाह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	4000	120	540	13.50	111	8	79	3	25	144


(भगत सिंह)
सहायक अभियन्ता
(लकनौकी)


सुशिल अभियन्ता
सा.वि.प्रा.
गा.का.व.



श्री. अनिल कुमार
सा.वि.
सा.वि.


Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2018-20 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	38.00	1.27	0.00	0.00



(सुशील कुमार चौधे)
विशेष कार्याधिकारी



अनिल कुमार सिंह
सचिव


अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: July, 2020.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77		7	हाँ


(भगत सिंह)
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



मुख्य अभियन्ता
07/08/2020
010312



अनिल कुमार राव
सचिव


अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July,2020. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1	0	जल निगम द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण
		स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1	-
		मधुबन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12	-
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1	-
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0	-
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	-
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8	-
		इंदिराकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	-
		इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	12100	क्रियाशील	2	1	योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं।
		राजनगर एक्सटेंसन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	ट्रंक सीवर का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा क्रियाशील कराया जा चुका है


 (मगत सिंह)
 सहायक अभियन्ता
 (तकनीकी)




 मुख्य अभियन्ता
 पा० वि० प्र०
 पा० बा०


 सहायक अभियन्ता
 सचिव

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July,2020.तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटिफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Ghaziabad	170	2021	14.07.2005	162	33	32	0	11	0	0	11	0	11

राजीव रत्न शर्मा
नगर नियोजन

विशेष अधिकारी
नगर नियोजन
शा. नि. शा. शा.

अशोक शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

अशोक शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	738	13	6	1-Sh. Anil Tyagi Kanisth Lipic 2- Sh. Jagveer Singh, Mali	20	50	22	20	0	22

(मिर्ज़ापुरा)
(लाहौर)

(दिल्ली)
(क० त०)

शिवराम
लिपिक

कुशील कुमार (बी.डी.)
विशेष सहायक

कुशील कुमार राय
सचिव

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: July, 2020.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबन्ध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हॉं अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाइन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हॉं	www.gdaghaziabad.com	0

07-08-2020
CDIGVIJAY
BHARAT) AP

07/08/2020
(C.M. PANDEY
J.E.)

7/8
प्रशान्त मोहंता
सहायक अभियन्ता


10/8
(सुशील कुमार शर्मा)
विशेष अभियन्ता


10/8
अनाप कुमार शर्मा
सहायक

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की सभी वैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2017-18 के सत्यापित वैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	हाँ	हाँ	31.10.2018	27.11.2018	0


 मुख्य अधिकारी
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद


 मुख्य अधिकारी
 गाजियाबाद

विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0

(भगत सिंह) (सहायक अभियन्ता (तकनीकी))

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता (रू० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	अवशेष (3-4) (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अलोच्य माह तक की देयता (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रू० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	125257117.00	125257117.00	0	5326244.00	3988242.00	1338002.00	1338002.00

पिता नियंत्रक
गhaziabad विकास प्राधिकरण
गhaziabad

अमित कुमार राय
अधीक्षक

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	4251	107712	4251	66155	216	58760	216	53720	0.00	35700	0


(सुशील कुमार चौबे)
विशेष सहायिका


सुशील कुमार चौबे
विशेष सहायिका

सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/08/2020

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वादों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वादों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	4	0	0	4	1- Sh. Shipra Sersti, Ahinshakhan-1, Indrapuram 2- Shipra Vista Ahinshakhan-1, Indrapuram 3- Ramprastha Green Pocket, Vaishali Ghaziabad 4- Orange Country Ahinshakhan-1, Indrapuram


(सुशील कुमार चौधरी)
विशेष कार्यनिष्पत्ती


सुशील कुमार चौधरी

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/08/2020

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस.			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	183.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00

Kila

Kila


U.P. LDA
मुद्रालय
दिल्ली

Handwritten signature and stamp.

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1


S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																रिपोर्टिंग माह: July,2020, तक, रिपोर्टिंग तिथि: 10/08/2020							
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
1	7B09800734023N0	7B09800734001236	Faizabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Bapudham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856/00	00		3876.77	4654.50	2089.79	01/10/2020	0	856	856	0
2	09800734053N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528/00	00		1140.00	0.00	0.00	0	0	288	0	240
3	09800734063N0	7B09800734001698	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	9/26/2018	8917.53	2160.00	1440.00	2437.53	2880.00	1440/00	00		5872.11	6432.41	0.00	0	0	1440	1440	0
4	09800734073N0	7B09800734001699	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	9/26/2018	31957.89	3240.00	2160.00	22247.89	4320.00	2160/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
5	09800734083N0	7B09800734001700	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	9/26/2018	10054.92	990.00	660.00	7084.92	1320.00	660/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Dasna	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432/00	00		3032.96	3388.45	0.00	0	0	432	432	0
7	09800734103N0	7B09800734001702	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pragn Vihar	9/26/2018	33621.72	2865.00	1910.00	25026.72	3820.00	1910/00	00		5431.42	6067.98	0.00	30/06/2021	0	1200	1200	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	1	2	3	3a	3b	3c	4	5 (DD-MM-YY)	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
8	098007341133N0	7B09800734001703	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	9/26/2018	20361.17	2700.00	1800.00	12261.17	3600.00	1800	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
9	09800734133N0	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	10/30/2018	318.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252	00		0.00	0.00	0.00	09/01/2021	0	252	252	0
10	09800734143N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147	00		0.00	0.00	0.00	30/04/2021	0	147	147	0
11	09800734153N0	7B09800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	318	00		0.00	0.00	0.00	07/08/2021	0	318	318	0
12	09800734163N0	7B09800734002079	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	1/30/2019	34779.00	3420.00	2280.00	24519.00	4560.00	2280	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
13	09800734173N0	7B09800734002078	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	1/30/2019	1793.42	432.00	288.00	497.42	576.00	288	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
14	09800734183N0	7B09800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Arndhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251	00		0.00	0.00	0.00	0	0	251	0	0








 आशीष मिश्रा जी
 मुख्य नगर निवासी


Sl. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																Execution of Projects								
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process	
	1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	(DD-MM-YY)	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B
15	09800734203N0	7B09800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873	00		0.00	0.00	0.00	0	0	873	0	0	
16	09800734213N0	7B09800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789	00		0.00	0.00	0.00	08/09/2021	0	789	789	0	
17	09800734223N0	7B09800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946	00		0.00	0.00	0.00	0	0	946	946	0	
18	09800734233N0	7B09800734002097	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	1/30/2019	4653.12	444.00	296.00	3335.92	577.20	296	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
19	09800734273N0	7B09800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Civil Lines, Gonda	6/28/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
20	09800734243N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00		0.00	0.00	0.00	0	0	1493	0	0	
21	09800734263N0	7B09800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312	00		0.00	0.00	0.00	0	0	312	0	0	


 आशीष निलामुरी
 नगर नियंत्रण

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																Execution of Projects					No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process	
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project			No of Houses for which Tender has been awarded
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh										Nos	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)								
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
22	09800734243N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - I, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	0.00	0.00	0.00	0	0	1493	0	0	
23	09800734193N0	7B09800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333	00	0.00	0.00	0.00	11/06/2021	0	333	333	0	
24	09800734283N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriam North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	147	00	0.00	0.00	0.00	0	0	147	0	0	
25	09800734293N0	7B09800734002535	Ghaziabad	Ghaziabad	M/S R B Infrastate Pvt. Ltd. (Ghaziabad Development Authority)	Pvt Developers	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	8/29/2019	3064.2293	598.50	399.00	1268.9288	797.8005	399	00	0.00	0.00	0.00	0	0	399	0	0	

आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक


 आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: July,2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 10/08/2020

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
							Self	Trough Bank Loan						
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	513.60	342.40		0.00	0.00	0.00	856.00	513.60	342.44	856.04
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	2160	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	09800734083N0	Ghaziabad	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	660	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1910	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	09800734113N0	Ghaziabad	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	1800	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	151.20	100.80	375.80	0.00	0.00	0.00	627.80	151.20	100.80	252.00
10	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	88.20	58.80	185.00	0.00	0.00	0.00	332.00	88.20	58.80	147.00
11	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	190.80	127.20	130.00	0.00	0.00	0.00	448.00	129.00	0.00	129.00
12	09800734163N0	Ghaziabad	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
						Self	Trough Bank Loan							
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	473.40	315.60	32.69	0.00	0.00	0.00	821.69	473.40	178.53	651.93
17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	567.60	378.40	600.00	0.00	0.00	0.00	1546.00	250.00	200.00	450.00
18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Civil Lines, Gonda	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H/JS W/O JZ AS.

Q

[Signature]

आशीष शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

[Signature]
सचिव


Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 3

रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 10/08/2020

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation	
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)
1	2	3	4	Nos	27	28	29	30	31	32	33	Nos	35	36	37
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	96	172	588	0	856	0	0	0	0
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	09800734083N0	Ghaziabad	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	24	120	252	36	0	0	408	0	0	0	0
7	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1910	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	09800734113N0	Ghaziabad	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	0	0	135	0	117	0	252	0	0	0	0
10	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	103	0	44	0	147	0	0	0	0
11	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	318	0	0	0	318	0	0	0	0
12	09800734163N0	Ghaziabad	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2280	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31/8/20


S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure				
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation		
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage							
1	2	3	4	Nos	11	27	28	29	30	31	32	33	Nos	34	35	36	37
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	789	0	0	0	0	789	0	0	0	0	0
17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	898	0	0	48	0	946	0	0	0	0	0
18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Civil Lines, Gonda	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	333	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0
24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 आशी मख्य नगर विकास

Uttar Pradesh PMAY-MPR Format AHP Part 4


रिपोर्टिंग माह: July, 2020..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 10/08/2020

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units								Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Cenntral Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender					
					Nos	Nos								Nos						
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 आशी : पुरो
 मुख्या नगर : नगरक

18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	Project have been cancelled by V.C. order dated 19-11-2019 hance No-of Eligible EWS Unit=0
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Civil Lines, Gonda	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0



 JTB
 AB
 मुख्य नगर विकास अधिकारी

24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	Project have been cancelled by V.C. order dated 06-03-2020 hance No- of Eligible EWS Unit=0

Handwritten signature
जे. ए.

Handwritten signature
A.G.

Handwritten signature

आशीष शिंदेगुर्ग
मुख्य नगर नियोजक.

Handwritten signature
विकास कुमार शर्मा
सोनी

शमन योजना-2020 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में साप्ताहिक रिपोर्ट हेतु प्रारूप

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॅालम 8+पिछले माह का कॅालम 12

क्रम सं.	अभिकरण का नाम	गत सप्ताह तक के अवशेष आवेदन पत्रों की संख्या			सप्ताह में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			निस्तारण हेतु लंबित कुल आवेदन पत्रों की संख्या (5+8)	सप्ताह में निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या			निस्तारण हेतु लंबित कुल आवेदन पत्रों की संख्या (9-12)	कुल जमा/आगणित धनराशि (लाख में)	अभियुक्ति
		ऑनलाइन	ऑफलाइन	कुल	ऑनलाइन	ऑफलाइन	कुल		स्वीकृत	अस्वीकृत	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5.95	0

रिपोर्टिंग माह: July, 2020 सप्ताहांत दिनांक: 11/08/2020

11/08/2020

अनिल कुमार सिंह
सहायक सी. अभियंता (वि०/५५०)

सहायक सी. अभियंता
