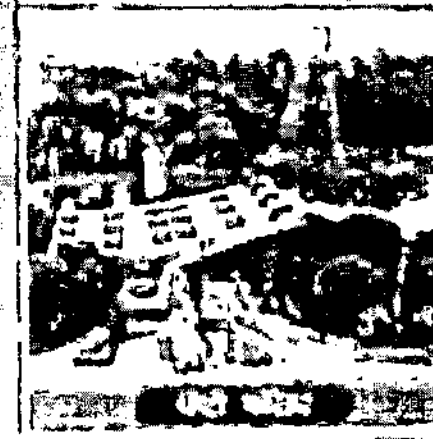
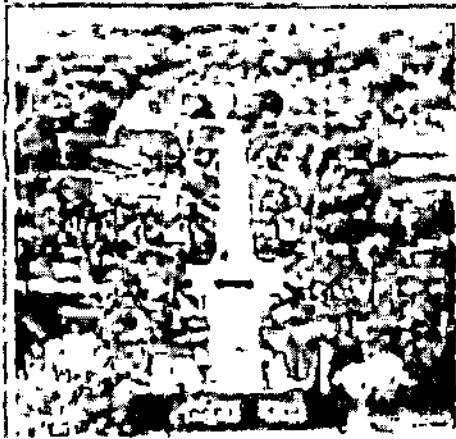
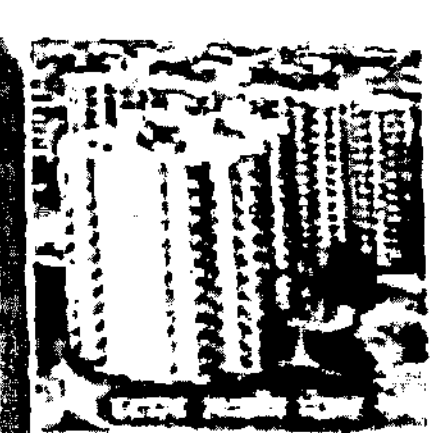
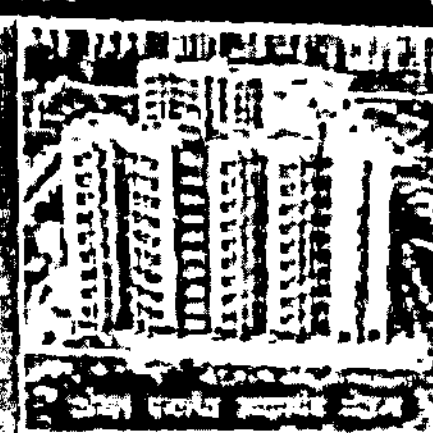
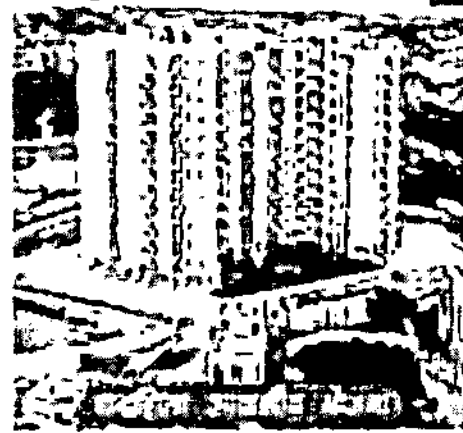




**JANUARY-2025**  
**MONTHLY PROGRESS**  
**REPORT**

**Ghaziabad**  
**Development**  
**Authority**



• **हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर** •

## INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	सी०ए०टी०पी०	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	पी०एम०ए०वाई सेल	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	पी०एम०ए०वाई सेल	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवटित भवनों की संख्या	NF-9
10	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ में)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16.	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17.	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18.	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19.	प्रभारी भू-अर्जन	लैण्ड बैंक	NF-20
20.	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21.	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (गुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	गुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	"	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाण पत्र' अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	प्रमारी प्रवर्तन	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रमारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	प्रमारी प्रवर्तन	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	प्रमारी प्रशासन	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (के)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	प्रमारी विधि	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्थोरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46
42.	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43.	प्रमारी सम्पत्ति	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटि को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)	NF-50
45	प्रमारी प्रवर्तन	Sustainable Development Goal-7 एवं मवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी०ए०टी०पी०	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	प्रमारी प्रशासन	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	प्रमारी सम्पत्ति	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किरतें, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	प्रमारी प्रवर्तन	अपार्टमेंट एक्ट कियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वार्दों का विवरण	NF-62
56	प्रमारी विधि	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वार्दों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी०ए०टी०पी०/अधिशासी अभियन्ता (प्रमारी) जोन-3/पी०एम०ए०वाई सेल	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65
58	सी०ए०टी०पी०/तहसीलदार /प्रमारी सम्पत्ति	एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- प्रगति विवरण	NF-68

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	54649	53020	53329	0	1629	0	79	0	0	0	0	0	0	54649	53099	53329	0	1550



सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)



मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)




मानदेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता


### वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Jan, 2025. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12349	12576	0	1013	0	38	0	0	0	0	0	0	13362	12387	12576	0	975

  
सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मानवन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॅलम 8+पिछले माह का कॅलम 12

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12717	10658	11633	0	2059	0	111	0	0	0	0	0	0	12717	10769	11633	0	1948

सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)


मानवन्द कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता


वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॅलम 8+पिछले माह का कॅलम 12

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8778	9061	0	3254	0	40	0	0	0	0	0	0	12032	8818	9061	0	3214

  
सुजीर कुमार चाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसारी अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता




वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6\* = आलोच्य माह का कौलम 4+पिछले माह का कौलम 6


रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	4030	0	0	0	6481	4030	0	0	4030

  
मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

  
भगवान दास मौर्य  
अवर अभियन्ता

  
वीरेंद्र चौहान  
सहायक अभियन्ता

  
अरविन्द कुमार  
टी०पी० / सी०टी०पी०

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु ) (भवनों की संख्या )	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में )		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में )		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भवनों भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+13*)			
1	Ghaziabad	10850	0	22.2339	0	5.005	0	1440	0	2056	0	7354	10850	0	0

मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

दीपती चौहान  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
टी०पी० / सी०टी०पी०

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

क्रम सं.	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओ की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओ की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओ के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओ द्वारा निर्माणाधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	12	0	12	0	7354	0	12	0	11	0	6481	0	6481

*Mary*  
मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

*विकास*  
भगवान दास शौर्य  
अवर अभियन्ता

*Shaw*  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

*अरविन्द*  
अरविन्द कुमार  
टी0पी0 / सी0पी0

प्रारूप संख्या NF-9

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	01.04.2024 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

20/2/25  
विनीत कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

1  
Nisal  
20/2/25

> वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	01.04.2024 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

*Kany*  
मनोज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

*MB*  
भगवान दास मौर्य  
अवर अभियन्ता


*Shau*  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता


*AK*  
अरविन्द कुमार  
टी०पी० / सी०टी०पी०


## मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण					अनावंटित रखने का कारण		
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्जा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्जा प्रदत्त			भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

  
मनोज कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्यक्ष  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11\* = आलोच्य माह का कैलम 10 + पिछले माह का कैलम 11

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकाशकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़) (10+11*)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	UPRERAPRM5538	21-05-2005	7/10/2009	4196.30	2681.94	201.90	0	184.50	3350.00	10	26811	1019.22	1019.22	06/06/2022	152.50	3502.72
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	UPRERAPRM7375	21-05-2005	11-05-2011	4312.99	684.07	309.69	0	185.913	827.65	9	21580	373.43		030/06/2016	0.00	96८.25

देया शंकर पाडे  
सुपरवाइजर

मन्नेज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

## हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू ,मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि ) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष )						परफॉर्मिसे गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIGके अलावा,अन्य वर्ग हेतु )
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा )	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति		आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल			
								क्षेत्रफल	भौतिक										दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग				दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	50	46	53	50	46	593	28	10	8	10	15	2120	13137	13137	8330	8330	1008	932	252	248	648	517	373.93	0	5450	
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0	146	

देया शंकर पांडे  
सुपरवाइजर

मनोज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता



## इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 3+4\* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	मेसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29/05/2006	3/2/2007	360	258.86	29.4	9.25	316	0	0	0	0	10/12/2013	0	1261.5
		मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ5463 & OTHER	29-05-2006	5/9/2007	99.75	99.75	0	0	99.75	0	0	0	0	14/09/2015	0	371.38
		मेसर्स अग्रवाल एसो० प्रमोटर्स लि०	UPREARPRJ1498& OTHER	29-05-2006	15.09.2006	184.69	184.69	8.65	184.69	1	0	0	0	0	07/10/2013 12/06/2021	0	487.08
		मे० यूटिलिटी स्टेट्स प्रा० लि० लीड मेम्बर मे० एम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड लि० (कन्सोर्शियम)	UPREARPRJ3055& OTHER	9/12/2008	30.10.2013	117.68	77.28	0.46	0.2496	77.28	1	0	0	0	10/12/2013 12/06/2021	0	239.46
		मेसर्स एस० एम० वी० एजेंसीज प्रा० लि०	UPREARPRJ5719& OTHER	29-05-2006	13-02-2007	300	210	3.48	0	226.5	0	0	0	0	30/09/2011 11/06/2018	0	454.4
		मेसर्स सामग कंस० लि०	UPREARPRJ3882& OTHER	29-05-2006	23-02-2007	72.9	68.88	0.41	0	72.9	0	0	0	0	27/11/2015	0	400.00
		मेसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा० लि०	UPREARPRJ5633& OTHER	29-11-2006	22-10-2007	91.6	70	5.66	0.3158	79.75	0	0	0	0	8/12/2020	0	480.30

देवा शंकर पांडे  
सुपरवाइजर

मनोहर कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

## इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोइल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)					प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण क्षेत्रफल भौतिक	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति		आवंटित		बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल			
																		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	80	63	75	75	70	38.58	13	0	0	0	0	0	2214	2214	1575	1575	496	468	0	0	496	466	3080	0	15000	
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	424	424	424	424	128	32	0	0	0	0	3080	0	2960	
		मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	100	100	100	100	100	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	152	240	36	0	152	240	0	0	1970	
		मै0 यूटिलिटी स्टेट्स प्रा0लि0 लीड मेम्बर मै0 एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम)	70	80	85	85	90	10.38	3	0	0	0	0	0	569	569	110	110	24	24	110	110	15	15	0	0	1093	
		मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	63	48	57	57	48	17.10	1	0	0	0	0	0	450	450	270	270	0	0	264	34	244	272	0	0	2100	
		मैसर्स सामग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.50	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	0	0	360	360	360	360	0	0	666	
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0	65	83	65	65	65	4.30	0	0	0	0	0	0	303	303	229	229	167	74	0	0	224	1160	0	0	2295	

देया शंकर पांडे  
सुपरवाइजर

मन्नाज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता


दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता


## सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)


उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 5


रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त भूखण्ड आवासीय (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल भूखण्ड (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में) (क्रमिक योग)
									संख्या(9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	250	0	47	0.00	0.00	297	0	34	8908.43	263	18057.88

  
अमित पाल  
कनिष्ठ लिपिक

  
रामबीर  
कनिष्ठ लिपिक

  
हेमन्त शर्मा  
कनिष्ठ लिपिक

  
क. सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

  
क. प्रसाद  
कनिष्ठ लिपिक

  
धर्मपाल सिंह  
क० लिपिक

  
नरेश कौर  
कनिष्ठ लिपिक

## सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानं + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल सम्पत्तियां (संख्या)(6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में)
									संख्या (9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	269	0	25	275	275	294	0	19	11576.07	275	52614.77
1	Ghaziabad	269	0	25	269.00	269.00	294	0	19	11576.07	275	52614.77

20/2/25  
प्रमुख कार्य  
लिपि

दा. 20/2/25  
(कानिका कौशिक)  
अंतरसूचना/प्रशासकीय-व्यावसायिक


## सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण


रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025


क्र.सं.	अधिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है	प्रारम्भ से 31.03.2024 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	4926	4926	6984	6341	395	11662	582	1296.49

  
प्रगात कुमार  
वरिष्ठ सहायक

  
अमित पाल  
कनिष्ठ लिपिक

  
समबीर  
कनिष्ठ लिपिक


  
देवानन्द शर्मा  
कनिष्ठ लिपिक

  
नरेश सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

  
रावैश्याम प्रसाद  
कनिष्ठ लिपिक

  
विमलेश कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

  
धर्मपाल सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

  
नरेश कौर  
कनिष्ठ लिपिक

भू-अर्जन

प्रारूप संख्या NF-20

## लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कालम 13+पिछले माह का कालम 14

रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति							वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)								अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	0.00	0.00	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	133.78	393.79	

hejpd

सचिन तामर  
लेखपाल


Jan

कार्तिक ठाकुर  
लेखपालसुशील कुमार चौबे  
(प्रभारी भू-अर्जन)महिपाल सिंह  
अमीन


ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया


रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.65	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00
		सद्दीकनगर ख0 सं0 1013 , 1014	208.00	राज नगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0.00

  
महिपाल सिंह  
अधीन

  
साचिन कुमार  
लेखपाल

  
कार्तिक कुमार  
लेखपाल


  
सुशील कुमार चौबे  
(प्रभारी भू-अर्जन)


## सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2024 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय- सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1690	492	2182	60	766	0	766	1416	0

  
प्रभात कुमार  
वरिष्ठ सहायक


  
अमित पाल  
कनिष्ठ लिपिक


  
रामबीर  
कनिष्ठ लिपिक


  
देवानन्द शर्मा  
कनिष्ठ लिपिक

  
महेश पाल सिंह  
क० लि०

  
शिवश्याम प्रसाद  
कनिष्ठ लिपिक

  
विनय कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

  
धर्मपाल सिंह  
क० लिपिक

  
नरेश कौशिक  
लिपिक



## आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	861	173	1408	2269	169	1245	1015	9	0	0	0	Nil

शिव मेश्रान  
अवर अभियन्ता

नीरज गुप्ता  
अवर अभियन्ता

मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

भगवान दास मौर्ध  
अवर अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

पवन गुप्ता  
सहायक अभियन्ता


अरविन्द कुमार  
टी०पी० / सी०टी०पी०

## अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	332	27	294	626	10	93	524	9	0	0	0	Nil


भगवान दास  
अवर अभियन्ता




यशवंत गुप्ता  
सहायक अभियन्ता



दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता



अरविन्द कुमार  
टी०पी० / सी०टी०पी०




मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

## ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	75	3	32	107	2	15	90	2	0	0	0	Nil



श्री १६/२/२५

(१९/२/२५)



मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता



मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता




भगवान दास नौर्य  
अवर अभियन्ता



श्री १६/२/२५  
सहायक अभियन्ता



श्री १६/२/२५  
सहायक अभियन्ता



अरविन्द कुमार  
टी०पी०/सी०टी०पी०

## भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	56	4	4	60	0	0	72	2	0	0	0	Nil

P

Kamran

[Signature]

भगवान दास  
अवर अभियन्ता

[Signature]

पवन गुप्ता  
सहायक अभियन्ता

[Signature]

अरविन्द कुमार  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता  
सी0टी0पी0

[Signature]

नीरज गुप्ता  
अवर अभियन्तामनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि.31.03.2024 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	1565	160	1113	2678	164	2671	7

रिपोर्टिंग  
(20/2/25)

नीरज गुप्ता  
अवर अभियन्ता

मनोज कुमार गीह  
अवर अभियन्ता

भगवान दास  
अवर अभियन्ता

नीरज गुप्ता  
सहायक अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
टी0पी0 / सी0टी0पी0

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण  
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7\* = आलोच्य माह का कॅलम 6+पिछले माह का कॅलम 7

रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.31.03.2024 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि.31.03.2024 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि.31.03.2024 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृत मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	2634	258	2376	23	65	2441	0	6	2435

*Pf*  
21/3/25  
(50 take)

*नीरज गुप्ता*  
अवर अभियन्ता

*मनोज कुमार गौड़*  
अवर अभियन्ता

*भगवान दास*  
अवर अभियन्ता

*घयन गुप्ता*  
सहायक अभियन्ता

*दीप्ती चौहान*  
सहायक अभियन्ता

*अरविन्द कुमार*  
टी0पी0 / सी0टी0पी0

## वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9\* = आलोच्य माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 9

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को संचित धनराशि (रू.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	31715.37	47741.00	0.00	0.00	79456.37	16667.99	99493.98	60886.17	163.41	10815.02	10.87

  
 वित्त नियंत्रक  
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
 गाजियाबाद

## विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-02-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रू० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां (रू० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रू० लाख)		शमन (रू० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रू० लाख)		भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रू० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा वेटरमेंट चार्ज ;रू० लाख		अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय (रू० लाख)		कुल अर्जित आय (रू० लाख)			
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	40024.65	129448.00	19768.35	27602.31	3108.38	3472.12	0.00	3413.00	31.12.2016	0.12	0.00	9209.45	21307.92	28799.87	43698.63	60886.17	99493.98	

वित्त नियंत्रक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद



वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कालम 13+पिछले माह का कालम 14

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-02-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2024 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	37871.14	31.12.2016	3413.00	3071.91	1736.06	21307.92	0	26115.89	63987.03	25251.00	146.64	3253.7799999999997	38736.03


वित्त नियंत्रक  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद

## निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	28450.00	562.53	9776.73	34.36


  
 वित्त निदेशक  
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
 गाजियाबाद


**अवैध निर्माण**  
(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12\* = आलोच्य माह का कालम 11+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	15752	5695	769	10826	1	36	82	546	26	120	2	10668	2326/2023 2450/2023 2408/2023	11.08.2023 06.10.2023 08.11.2023

  
**मनोज कुमार गौड**  
अवर अभियन्ता  
प्र.सं. नोडल

  
**अनुज कुमार**  
सहायक अभियन्ता

## प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॅालम 5+पिछले माह का कॅालम 6

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2024 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	123	0	123	0	26	74.25	0.00	0.00	0.00

Kamal  
13/02/25  
कमलदीप  
अवर अभियन्ता

सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)

मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता


## अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)				चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/ व्यय घनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)		
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग		अनुमोदित (संख्या)	निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित (संख्या) (9+10)	कार्यवाही स्तर		आलोच्य माह तक प्राप्त (रू. लाख)	आलोच्य माह तक व्यय (रू. लाख)	प्रारम्भ कालोनिया संख्या		पूर्ण कालोनिया संख्या	
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)	5+6					प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0.00	0.00	0	0	0

  
 अनोज कुमार  
 अवर अभियन्ता  
 प्रवर्तन नोडल

  
 अनुज कुमार  
 सहायक अभियन्ता

## वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह—जनवरी 2025 रिपोर्टिंग तिथि : 30.01.2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3X100)
			< 08 फुट (ऊँचाई)	≥ 08 फुट (ऊँचाई)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उद्यान अनुभाग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	1,50,000	1,30,092	0	1,30,092	86.72%


  
संजीव कुमार  
उद्यान निरीक्षक


  
आलोक रंजन  
प्रभारी उद्यान


## रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2024-25)

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	4	0	0	100	7	27	0.00	0.00	0	162226.68	78433.36	0	0.00	0.00

  
सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 24-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)						अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)		
		हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्पूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा० मुख्य मंत्री संदर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	3	0	9	458	0

कालेन नं० ७/२४/२५  
 ↓  
 [Signature]

[Signature]  
 [Stamp: अविवाहाधिका...]  
 [Stamp: ...]


[Signature]  
 [Stamp: ...]  
 [Stamp: ...]  
 [Stamp: ...]




## प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan, 2025.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0


  
 13/02/25  
 सुमित रावत  
 लिपिक  
 गाजि0 विकास प्राधिकरण

  
 19/1/25  
 (कानिका कौशिक)  
 प्रभारी-व्यवसायिक

## माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan, 2025 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीनवादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)	दाखिल रिव्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	47	1108	5	52	1212.00	44	1070	3	49	1166	10	8	7	5	116	124


  
चन्द्र भूषण त्रिपाठी  
कनिष्ठ लिपिक


  
राजि भूषण राय  
विधि अधिकारी  
कनिष्ठ प्रा० गाजियाबाद

## ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्वोरमेन्ट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	श्री राज कुमार वर्मा	10	पूर्ण हो चुकी है।	0	माह अप्रैल 2017 से लागू 0		पूर्ण हो चुकी है।	हाँ	0

1  
  
 निविदा भारत  
 सहायक प्रोग्रामर  
 गा0 वि0 प्रा0


  
 आर0 के0 वर्मा  
 अधिशासी अभियन्ता


### अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7\* = आलोच्य माह का कालम 6+पिछले माह का कालम 7

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2024 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2024 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	23	0	0	0	6

  
सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसारी अभियन्ता  
(तकनीकी)


  
मनोज कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा


उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त ) (रू० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू० करोड़ में)
			माह में व्यय (रू० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	284.50	5.62	107.23	16.08

  
मनोज कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9\* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	वैशाली	वैशाली	375	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		पटेल नगर	आवासीय भूखंड	170	02.05.1985	अतिक्रमण के कारण स्थगन आदेश प्राप्त है	0	0
		प्रताप विहार	प्रताप विहार	78	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-107	60	30.08.2007	रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ए -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	29.7	08.03.2010	अनुबन्ध विलेख/रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	ई-52	90	30.08.2007	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2098 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा न करने के कारण आवंटन निरस्त	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई0 डब्लू0 एस0	31.79	31.12.2009	अनुबन्ध न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	31.79	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0

श्रीमती कुमारी  
कनिष्ठ सहायक

श्रीमती पाल  
कनिष्ठ लिपिक

श्रीमती देवानन्द शर्मा  
कनिष्ठ लिपिक

श्रीमती महेश जील सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

श्रीमती प्रसाद  
कनिष्ठ लिपिक

श्रीमती कुमारी  
कनिष्ठ लिपिक

श्रीमती सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

श्रीमती कौशिक  
कनिष्ठ लिपिक

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		नेहरू नगर	थर्ड एन -5 डी	72	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	345.4	02.01.1992	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 35	इंद्रापुरम भवन - 35	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम भवन - 70	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	भवन संख्या एल-13 एवं एल-146 के आवंटी द्वारा धनराशि जमा करायी गयी है।	0	0
		वैशाली	एल आई जी	52	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/887	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		कौशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	ई0डब्लू0 एस0	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	274 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	01.8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	19.5	27.09.2016	निर्माणाधीन पेमेंट शेड्यूल जारी	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ - 367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	मिनी एम् आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-29 प्लॉट	162	01.04.2006	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		कोयल एन्क्लेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0

प्रभात कुमार  
वरिष्ठ सहायक

http://mpr.upda.co.in/Admin/Annex48.aspx

अमित कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

प्रवीर  
कनिष्ठ लिपिक

विमानन्द  
कनिष्ठ लिपिक

महेश  
क0 लिपिक

चाल सिंह  
राधेश्याम प्रसाद  
कनिष्ठ लिपिक

विमलेश कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

क0 लिपिक

नरेश कौशिक  
कनिष्ठ लिपिक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	228.24	दिनांक 14 -06 -2011 को नोटिस	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	31.12.2009 रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		नेहरू नगर थर्ड	एन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एम आई जी 6 भवन	28.56	22.11.2011	02 आवंटी द्वारा कब्जा लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	68	10.03.2005	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-77 60	60	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम0आई 0जी0	47.23	11.11.2005	निर्माणाधीन	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना	मधुबन बापूधाम योजना	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

प्रभात कुमार  
वरिष्ठ सहायक

अमित पाल  
लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

इवानन्द शर्मा  
कनिष्ठ लिपिक

महेश पाल सिंह  
कनिष्ठ लिपिक

विमलेश कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

बसंतपाल सिंह  
क0 लिपिक

कनिष्ठ लिपिक



क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		संजय नगर	एल आई जी	22	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		नेहरू नगर	नेहरू नगर	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90	23.07.2007	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	एन० के०- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन० के०- 1/582	1582	02.06.1990	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		वेशाली	वेशाली	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वेशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-33	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	0	0
		इंदिरापुरम	एन० के०- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	ज्ञानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए, 182, 183	69.33	69.33	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम् आई जी	50.28	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	112	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई -72	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		राजेंदर नगर	ई०डब्लू० एस०	35.6	25.06.2009	न्यायालय में वाद विचाराधीन	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78	60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0

प्रभात कुमार  
वरिष्ठ सहायक

अमित पाल  
कनिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चातु वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	19.5	02.01.1992	0	0
		गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	30.11.2013	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/878 प्लॉट	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77,158,192सी	एम् आई जी	150	77	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	22.08.2014	प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0

प्रभात कुमार  
वरिष्ठ सहायक

अमित पाल  
कनिष्ठ लिपिक

रामबीर  
कनिष्ठ लिपिक

देवानन्द शर्मा  
कनिष्ठ लिपिक

महेश पाल सिंह  
क0 लि0 रावेशराम प्रसाद  
कनिष्ठ लिपिक

विमलेश कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

धर्मपाल सिंह  
क0 लिपिक


नरेश कोशिक  
लिपिक


**आवास एवं शहरी नियोजन विभाग**  
**रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति**  
**स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2024-25 हेतु)**


उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	472	2407	40.12	505	50	358	0	121	560

  
 सुधीर कुमार पाण्डेय  
 सहायक अभियन्ता  
 (तकनीकी)

  
 मनोज कुमार उपाध्याय  
 अधिशासी अभियन्ता  
 (तकनीकी)


  
 मानवेन्द्र कुमार सिंह  
 प्र० मुख्य अभियन्ता


Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2024-25 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	38.00	2.86	0.00	0.00


  
पूजा कुमार गौर  
अवर अभियन्ता  
प्रवर्तन नोडल


  
अनुज कुमार  
सहायक अभियन्ता

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77		7	हाँ

  
सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिशासी अभियन्ता  
(तकनीकी)


  
मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता


## अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुवधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Jan, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1-	
		मधुबन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	5424	क्रियाशील	12	12-	
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1-	
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0-	
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8-	
		इंदिराकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0-	
		इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0-	योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं।
		भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1	1-	
		राजनगर एक्सटेंसन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	

  
सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)


  
मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता


महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति


दिनांक 31.01.2025


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ तक कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह प्राप्त तक कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	170	2021	14.07.2005	162	33	32	11	0	0	0	10	1	1

टिप्पणी :- 1. जोन-1 का जोनल प्लान शासन से अनुमोदित है।


  
 देवेन्द्र  
 मानचित्रक  
 नियोजन अनुभाग

  
 नितिन कुमार  
 मानचित्रक  
  
 राममोहर गिरि  
 मानचित्रक

  
 31/01/25  
 त्रिलोक कुमार  
 मानचित्रक

  
 P. V. Rao  
 मानचित्रक  
 भा.वि.090





  
 प्रबुद्ध राज सिंह  
 सहायक अभियन्ता

  
 31/1/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
 गाजियाबाद

## अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 24-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	529	4		Shri Subhash singh work supervisor & Shri Pankaj, Mali	9	0	40	40	0	42

सहायक प्रभारी प्रशासन  
 गा0 वि0 प्रा0,  
 गाजियाबाद



आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Jan, 2025, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबन्ध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं? मात्र हों अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हो	www.gdaghaziabad.in	0

*jk*  
13.02.2025  
(अरुण कुमार)  
को ऑपररेटर

## अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	हैं	हैं	29.09.2022	14.10.2022	0

वित्त नियंत्रक  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद


## विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-02-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0



सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)



मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(तकनीकी)



मानदेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-02-2025

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2024 तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2024 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	175614927.00	175614927.00	0	3935658.00	3661302.00	274356	274356

वित्त नियंत्रक  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद

## Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-02-2025

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	4547	110740	4547	77190	4547	58760	216	53720	0	35700	0

*Handwritten signature*  
**अनुज कुमार गौड**  
 जवर अभियन्ता  
 प्रवर्तन नोडल

*Handwritten signature*  
**अनुज कुमार**  
 सहायक अभियन्ता

## सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-02-2025

क्रम सं	आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वदों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वादों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	1	0	0	1	1. आदि बेस्ट क्लाउड-9, भूखण्ड सं0 आर0सी01/2 सैक्टर-1 वैशाली गाजियाबाद

1  
Kangra  
मनोज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता  
प्रवर्तन नोडल

अनुज कुमार  
सहायक अभियन्ता

## महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कॅलम 13+पिछले माह का कॅलम 14

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	7.00	0.00	7.00	63.00	0.00	63.00	54.00	0.00	54.00	9.00	0.00	9.00

चन्द्र भूषण त्रिपाठी  
कनिष्ठ लिपिक

राजि भूषण राय  
चिट्ठी अधिकारी  
कनिष्ठ प्रा० गाजियाबाद

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
								(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh				Nos		Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)						
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
1	7B09800734023N0	7B09800734001236	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Bapudham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856/00	00		3878.77	4654.50	2757.20	01/10/2020	0	856	856	0
2	09800734053N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528/00	00		2502.37	2830.39	249.17	0	0	528	528	0
3	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432/00	00		3000.00	3388.45	1137.00	30/09/2021	0	432	432	0
4	09800734133N0	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252/00	00		0.00	0.00	0.00	09/07/2021	0	252	252	0
5	09800734143N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147/00	00		0.00	0.00	0.00	30/10/2022	0	147	147	0
6	09800734153N0	7B09800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	318/00	00		0.00	0.00	0.00	07/02/2022	0	318	318	0
7	09800734183N0	7B09800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya, Vill. Paraunda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251/00	00		0.00	0.00	0.00	31/05/2023	0	251	251	0
8	09800734203N0	7B09800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

मनोहर गौड़  
अवर अभियन्ता

वास मौर्य  
अवर अभियन्ता

श्याम  
वीरवीर  
सहायक अभियन्ता

सुधीर कुमार  
टीओपीओ / सीओपीओ




S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B
							Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad																	
9	09800734213N0	7B09800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789/00	00		0.00	0.00	0.00	08/03/2022	0	789	789	0
10	09800734223N0	7B09800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946/00	00		0.00	0.00	0.00	09/06/2022	0	946	946	0
11	09800734273N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480/00	00	3885.60	3885.62	379.12	19/06/2022	0	480	480	0	
12	09800734253N0	7B09800734002442	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493/00	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	1493	1493	0
13	09800734263N0	7B09800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyan - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312/00	00		0.00	0.00	0.00	24/03/2024	0	312	312	0
14	09800734243N0	7B09800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493/00	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	1493	1493	0
15	09800734193N0	7B09800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozon Classic, Vill. Noor Nagar	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333/00	00		0.00	0.00	0.00	11/12/2021	0	333	333	0


महेश कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

शशि चौखान  
सहायक अभियन्ता


अरवि कुमार  
टी०पी० / सी०टी०पी०

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been Boasted/Under Process
								(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh						Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)						
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
							& Vill. Saddiq, Ghaziabad																	
16	09800734283N0	7B09800734002077	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shiram North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	14700	00		0.00	0.00	0.00	06/08/2024	0	147	147	0
17	09800734103N0	7B09800734629580	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	120000	00		5431.42	6067.98	200.18	19/06/2022	0	1200	1200	0

  
 मनोज कुमार गौड  
 अवर अभियन्ता

  
 भगवान दास मौर्य  
 अवर अभियन्ता

  
 दीप्ती चौहान  
 सहायक अभियन्ता

  
 अरविन्द कुमार  
 टी०पी० / सी०टी०पी०

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)		
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary							
														Self	Trough Bank Loan
Nos	Rs. In Lakh							Rs. In Lakh							
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	988.20	658.80		0.00	0.00	0.00	0.00	1647.00	988.20	658.80	1647.00
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	316.80	211.20		0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	316.80	211.20	528.00
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	259.00	173.00		0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	259.00	173.00	432.00
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	297.00	198.00		1542.00	0.00	0.00	0.00	2037.00	284.00	191.00	475.00
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	176.40	117.60		764.77	0.00	0.00	0.00	1058.77	176.40	117.60	294.00
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	190.80	127.20		1304.34	0.00	0.00	0.00	1622.34	127.20	190.80	318.00
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	150.60	100.40		810.00	0.00	0.00	0.00	1061.00	99.00	81.00	180.00
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	924.00	616.00		2981.19	0.00	0.00	0.00	4521.19	924.00	616.00	1540.00
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	1085.40	723.61		3753.00	0.00	0.00	0.00	5562.01	1085.40	723.61	1809.01


मन्मथ कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता


भगवान दास मोर्य  
अवर अभियन्ता

श्यामली चौहान  
सहायक अभियन्ता


अरविन्द कुमार  
टी०पी०सी०

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
				Nos				Self	Trough Bank Loan					
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	288.00	192.00		0.00	0.00	0.00	480.00	288.00	192.00	480.00
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	187.20	124.80	490.00	0.00	0.00	0.00	802.00	40.00	35.00	75.00
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	199.80	133.20	5947.32	0.00	0.00	0.00	6280.32	199.80	133.20	333.00
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	88.20	58.80	735.00	0.00	0.00	0.00	882.00	88.20	58.80	147.00
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	720.00	480.00		0.00	0.00	0.00	1200.00	720.00	480.00	1200.00

  
 मनोज कुमार गौड़  
 अवर अभियन्ता

  
 भगवान दास मेहर  
 अवर अभियन्ता

  
 वीरजी चौहान  
 सहायक अभियन्ता

  
 अरविन्द कुमार  
 टी०पी०/सी०टी०पी०

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 3

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation	
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)
	Nos				Nos								Nos		
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	856	0	0	856
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	288	288	240	0	0	0
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0	432
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	0	0	147	0	147	0	0	0	0
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	0	0	318	0	318	0	0	0	0
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	251	0	251	0	0	0	0
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ममोजि कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

श्याम सुंदर  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
सी.टी.ओ.पी.ओ.


S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation	
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage						
						Nos	Nos									Nos
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
			Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad													
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	90	0	699	0	789	0	0	0	0	
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	0	0	946	0	946	0	0	0	0	
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0	0	0	0	48	336	384	96	0	0	96	
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	0	0	0	1493	0	0	0	0	
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	312	0	312	0	0	0	0	
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	0	0	0	1493	0	0	0	0	
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	0	0	333	0	333	0	0	0	0	
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP	147	0	0	0	0	147	0	147	0	0	0	0	

मनोहर सिंह  
भगवत सिंह मौरा  
अवर अभियन्ता


दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

अरविंद कुमार  
सीओटीपीओ

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation	
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage						
						Nos	Nos									Nos
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
			component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad													
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	0	0	0	36	12	360	408	792	0	0	792	

  
 मनोज कुमार गौड़  
 अवर अभियन्ता

  
 दीप्ती चौहान  
 सहायक अभियन्ता

  
 अरविन्द कुमार  
 टी०पी० / सी०टी०पी०

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 4

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14-02-2025

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dweeling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
					Nos	Nos						Nos							
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	0	0	00	Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0	
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	216	109	0	131	0	17	473	163	310	0	0	00	Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0	
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	159	109	3	149	0	10	430	153	277	0	0	00	Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0	
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	84	67	0	93	0	8	252	91	161	0	0	00	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0	
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	41	35	1	65	0	5	147	42	105	0	0	00	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0	
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs	318	130	72	1	75	0	9	287	90	197	0	0	00	PVT Developers Sh.	0	



S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC			Category- wise Allotment of Dwelling units								Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			under AHP component of PMAY-U at Ajnara															Arvind Kumar Mo-9958578002	
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	373	159	7	226	0	21	786	250	535	0	1	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	286	659	0	1	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Alotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total alotted DUs Sum of Gender wise alotted DUs = total alotted DUs Central Share utilised < or = Total Cenntal Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backword Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
					Nos	Nos				Nos				Nos					
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	480	231	96	8	127	0	16	478	195	283	0	0	00	Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0	
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0	
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyaam - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0	
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0	

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Alotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In the name of Transgender	Nos				
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	155	73	0	69	0	8	305	93	212	0	0	00		PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00		PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002	0
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	347	143	1	186	0	30	707	279	428	0	0	00		Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0

2/12/25  
विनीत कुमार  
कनिष्ठ लिपिक

N/Sel  
20/2/25

## एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - प्रगति विवरण

रिपोर्टिंग माह: Jan,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-02-2025

Sr.No.	Authority Name	Total Unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	In Current Month						Till Current Month					
			Increase In Land Bank	Number of Layout approved	Number of Map for non-residential plot sanction	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning	Increase In Land Till month	Number of Layout approved Till month	Number of Map for non-residential plot sanction Till month	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	493	0.00	0	10	0	0	133.78	0.00	5	276	34	108	133.78

Pp

2/13/25

Ho (Awas)

नीरज गुप्ता  
अवर अधियन्तामनोज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

Nayak

[Signature]

भगवान दास गौड़  
अवर अभियन्ता[Signature]  
दीपक गुप्ता  
सहायक अभियन्ता[Signature]  
दीपक गौड़  
सहायक अभियन्ता

[Signature]

अरविन्द कुमार  
टी0पी0 / सी0टी0पी0
