



NOVEMBER-2025
MONTHLY PROGRESS
REPORT

GHAZIABAD
DEVELOPMENT
AUTHORITY



चन्द्रशिला आवासीय योजना



समाजवादी आवास योजना



कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना



इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना



सचिव महोदय द्वारा वृक्षारोपण



लोहिया पार्क



सिटी फॉरेस्ट



सिटी पार्क

हमारा संकल्प: एक सुन्दर शहर

CE

प्रारूप संख्या NF-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8^*+12^* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित EWS भवन (8^*+12^*)	आवंटित EWS भवन (9^*+13^*)	पूर्ण भवन (10^*+14^*)	निर्माणाधीन भवन (11^*+15^*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन ($3+8+12$)	आवंटित भवन ($4+9+13$)	कुल पूर्ण भवन ($5+10+14$)	कुल निर्माणाधीन भवन ($11+15$)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन ($16-17$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	54649	53102	53329	0	1547	0	16	0	0	0	5	0	0	54649	53123	53329	0	1526

0a

0b

महेश कुमार चौलम

सुधीर कुमार पाण्डेव
सहायक अभियन्ता
(संरचनात्मक)

4
आलोक रंजन
प्र. मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - $8^*+12^* =$ पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12387	12576	0	975	0	62	0	0	0	34	0	0	13362	12483	12576	0	879



महेश कुमार
सहायक अभियन्ता



सुधीर कुमार
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



आलोक रंजन
प्रो. मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - $8*+12* =$ पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित MIG भवन (*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12717	10769	11633	0	1948	0	42	0	0	0	9	0	0	12717	10820	11633	0	1897



महेश कुमार
सहायक अभियन्ता-भवन



सुधीर कुमार यादव
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)

4
आलोच्य रंजन
प्रो मुख् अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8842	9061	0	3190	0	52	0	0	0	0	0	0	12032	8894	9061	0	3138



महेश कुमार
सहायक अभियन्ता-उपनिवेश



सुधीर कुमार
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



आलोक रंजन
प्र० मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	3765	0	0	0	6334	3765	0	38	3727

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

Manoj Kumar Gaud
मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

Vipin Chohan
वीपिन चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

Jitendra Kumar
जितेन्द्र कुमार
मुख्य नगर नियोजक

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 24-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	542	0	0	816	816	1358	0	818	540

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिह्नित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+13*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	10850	0	22.2339	0	5.005	0	1440	0	2058	0	7354	10850	10850	0

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रासूप संख्या NF-8

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में


उदाहरण - $8*+12* =$ पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्रम सं.	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	12	0	12	0	7354	0	12	0	11	0	6481	0	6481


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाओ वि० प्रा०


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

विमल 31

प्रारूप संख्या NF-9

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या
उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025								
क्र.सं.	अभिकरण का नाम	01.04.2025 को सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

20/12/2025
वनजय नीरव
अवर अभिकर्ता

सुरजित
अवर अभिकर्ता

20/12/2025
B. R.
राजीव कुमार सिंह
प्रकाश पीएमएसवाई0

> वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	01.04.2025 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ता चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

अराविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रारूप संख्या NF-11

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण							अनावंटित रखने का कारण
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्जा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्जा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।



महेश कुमार
उपर अधिवक्ता-नगरपालिका



सुधीर कुमार पण्डेय
सहायक अधिवक्ता
(तकनीकी)



आलोक रंजन
प्रमुख अधिवक्ता

प्रारूप संख्या NF-13

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कॉलम 10 + पिछले माह का कॉलम 11

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकाशकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामो की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामो की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़) (10+11*)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	मैसर्स उज्जल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	UPRERAPRM5538	21-05-2005	10.07.2009 07.10.2023 09.10.2024	4196.30	2696.20	201.90	0.00	184.50	3350.00	10	26811	1019.22	1019.22	06.06.2022	160.00	3702.72
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	UPRERAPRM7375	21-05-2005	22.07.2011 03.10.2023	4312.99	816.32	309.69	0.00	185.913	827.65	10	21580	373.43	0.00	30.06.2016	0.00	965.25

राम किशन
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रारूप संख्या NF-14

हार्डटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

रिपोर्टिंग माह: 10/08/2025, तबतक, रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025																											
क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंबली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIG के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाय	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति		आवंटित		बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल	
								क्षेत्रफल	भौतिक										दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्ढा हार्डटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	57	55	61	59	53	593	28	10	16	15	14	4177	10442	10442	6944	6944	1008	932	1440	1440	648	517	379.90	0.00	14230
		मैसर्स सनसिटी हार्डटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0.00	146

राम चन्द्र
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक
गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रारूप संख्या NF-15

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -I

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कैलम 3+पिछले माह का कैलम 4

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामो की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामो की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	मैसर्स कासिंग इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29/05/2006	3/2/2007	360	258.86	29.4	9.25	316	0	0	0	0	10/12/2013	0.00	1261.5
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ5463 & OTHER	29-05-2006	5/9/2007	99.75	99.75	0	0	99.75	0	0	0	0	14/09/2015	0.00	371.38
		मैसर्स अग्रवाल एसो० प्रमोटर्स लि०	UPREARPRJ1498& OTHER	29-05-2006	15.09.2006	184.69	184.69	8.65	8.65	184.69	0	0	0	0	07/10/2013 12/06/2021	0.00	487.08
		UPREARPRJ3055& OTHER	9/12/2008	30.10.2013	30.10.2013	117.68	77.28	0.46	0.2496	77.28	1	0	0	0	10/12/2013 12/06/2021	0.00	239.46
		मैसर्स एस० एम० वी० एजेसीज प्रा० लि०	UPREARPRJ5719& OTHER	29-05-2006	13-02-2007	300	210	3.48	0	226.5	0	0	0	0	30/09/2011 11/06/2018	0.00	454.4
		मैसर्स सामग कंस० लि०	UPREARPRJ3882& OTHER	29-05-2006	23-02-2007	72.9	68.88	0.41	72.9	0	0	0	0	0	27/11/2015	0.00	400
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा० लि०	UPREARPRJ5633& OTHER	29-11-2006	22-10-2007	91.6	70	0.00	5.66	79.75	0	0	0	0	8/12/2020	0.00	480.3



सम चन्द्र
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेप्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति		आवंटित		बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल	
								क्षेत्रफल	भौतिक										दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	80	63	75	75	70	38.58	13	0	0	0	0	0	2239	2239	1575	1575	496	468	0	0	496	466	3080	0	15000
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	424	424	424	424	128	32	0	0	0	0	2587	0	2960
		मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	100	100	100	100	100	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	152	240	36	0	152	240	0.00	0.00	1970
		मै0 यूटिलिटी स्टेट्स प्रा0 लि0 लीड मेम्बर मै0 एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोशियम)	70	80	85	85	90	10.38	3	0	0	0	0	0	569	569	110	110	24	24	110	110	15	15	0.00	0.00	1093
		मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	63	48	57	57	48	17.10	1	0	0	0	0	0	450	450	270	270	0	0	264	34	244	272	0.00	0.00	2100
		मैसर्स सामग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.50	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	0	0	360	360	360	360	0.00	0.00	666
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0	65	83	65	65	65	4.30	0	0	0	0	0	0	303	303	229	229	167	74	0	0	224	116	0.00	0.00	2295

12/25


राम चन्द्र
सहायक अभियन्ता

महानगर विकास प्राधिकरण

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त भूखण्ड आवासीय (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल भूखण्ड (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
									वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण	संख्या (9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	66	1	6	0.00	0.00	72	1	15	256.87	57	12668.49


महेश पाल सिंह
0 लि०


पवन कुमार सक्सेना
कनिष्ठ निपिक


नरेन्द्र कौर
निपिक


वन्देप सिंह
निपिक


अनुज कुमार
सहा० प्रभारी सम्पत्ति


शशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)
प्रभारी सम्पत्ति ज़ोन-4/5


श्याम अवध चौहान
संयुक्त सचिव-3
गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद


श्याम अवध चौहान
संयुक्त सचिव/प्रभारी सम्पत्ति
गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद

अवसिति

प्रारूप संख्या NF-18

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकान + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025												
क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल सम्पत्तियां (संख्या)(6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में)
									संख्या (9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	252	0	6	0.00	0.00	258	0	19	7300.28	239	58776.89

CC

CC

प्रारूप संख्या NF-19

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है					
		प्रारम्भ से 31.03.2025 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.2025 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	4926	4926	6260	6052	0	10978	1206	2493.85

महेरा पाल सिंह
वॉ 0 डिप्टी माल
कनिष्ठ लिपिक

पवन कुमार सक्सेना
कनिष्ठ लिपिक

नरेश कनिष्ठ
लिपिक

पत्रधूषण त्रिपाठी
लिपिक

अनुपम कुमार
सहाय - नगरपालिका

शशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)
प्रमारी सम्पत्ति जोन-4/5

श्याम अवध चौहान
सयुक्त सचिव-3
गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद

एम०पी० सिंह
सयुक्त सचिव/प्रमारी सम्पत्ति
गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद

श्री-अर्जन

प्रारूप संख्या NF-20

लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2025 की स्थिति							वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)							अर्जन हेतु	कब्जा	नियोजन	विकास
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	29.24	29.24	165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	165.71	423.03

अमित कसाना
अमीनकार्तिक ठाकुर
लेखपालसचिन तोमर
लेखपालविवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रभारी (मु. अ.)
गा. 200

प्रारूप संख्या NF-21

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: Nov. 2025, तक, रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/ सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00
		सद्दीकनगर ख0 सं0 1013, 1014	208.00	राज नगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0.00

अमित


अमित

कार्तिक ठाकुर
लेखपालसचिन तोमर
लेखपालविवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रणाली (गू0 अ0)
गा0 303030


सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025


क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2025 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनो में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय- सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1135	1346	2481	60	829	43	872	1609	Nil

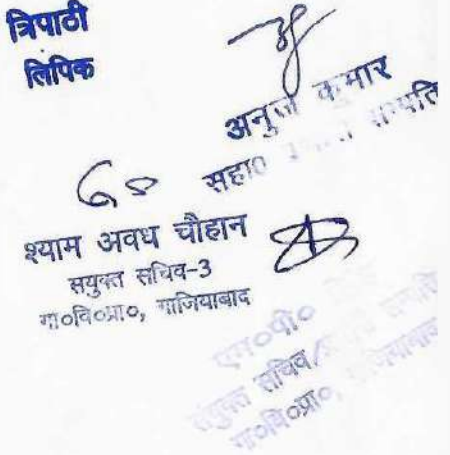

अंशुल खन्डवाल
कनिष्ठ लिपिक

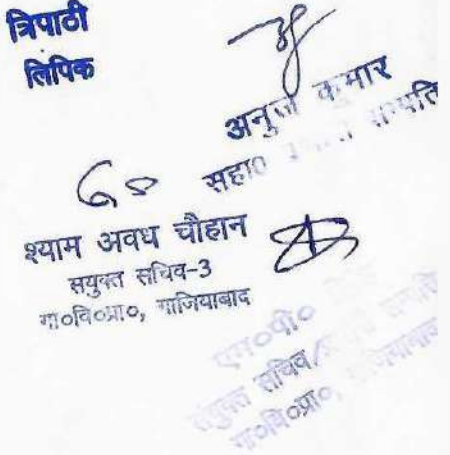

पवन कुमार सक्सेना
कनिष्ठ लिपिक

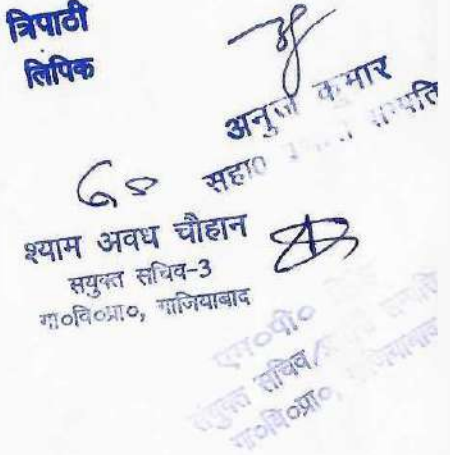

नरेन्द्र कौर
लिपिक


चन्द्रभूषण त्रिपाठी
लिपिक


शशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)
प्रभासी सम्पत्ति जॉन-4/5


अनुराग कुमार
सहायक प्रमुख सम्पत्ति


श्याम अवध चौहान
संयुक्त सचिव-3
गा.वि.0प्रा.0, गाजियाबाद


श्याम अवध चौहान
संयुक्त सचिव-3
गा.वि.0प्रा.0, गाजियाबाद

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025 लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	11	172	988	999	191	849	26	124	0	0	0	Nil


नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025 लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	11	41	226	237	26	91	26	120	0	0	0	Nil


गिरज गुप्ता
नगर अभियन्ता


नोज कुमार गौड़
नगर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाO विO प्राO


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रारूप संख्या NF-25

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025 लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	6	41	41	2	10	10	21	0	0	0	Nil


नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	1	3	19	20	1	10	5	5	0	0	0	Nil


नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


मोहन
अभियन्ता
वि० प्रा०


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृति ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि.31.03.2025 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	2	146	847	849	165	842	7


नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0



अरावन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.31.03.2025 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि.31.03.2025 तक कुल निर्गत पूर्णता- प्रमाणपत्र	दि.31.03.2025 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता- प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता- प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	2935	271	2664	31	195	2859	1	12	2847


अनुज कुमार
अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल


नीरेंद्र कुमार
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक


अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता


वीरेंद्र कुमार
अधिसारी अभियन्ता
प्रवर्तन सेल

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2025 को संचित धनराशि (रू.लाख)					रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 04-12-2025					
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2025- 26 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	68969.81	74335.00	0.00	0.00	143304.81	14054.94	158295.98	73287.13	215.99	5367.38	3.39

वित्त नियंत्रक
प्रशासनिक विभाग प्रमुख
महानगरपालिका

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov. 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रु० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियाँ (रु० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रु० लाख)		शमन (रु० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा बेटरमेंट चार्ज (रु० लाख)		अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)		कुल अर्जित आय (रु० लाख)	
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (5+7+9+12+14+16)	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (6+8+10+13+15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Ghaziabad	141040.08	262342.00	19590.26	34626.30	2114.56	3523.72	0.00	7976.55	31.12.2016	0.00	1056.55	17771.43	8512.87	33810.88	102599.99	73287.13	158295.98

मिल निवेदन

4

10

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कैलम 13+पिछले माह का कैलम 14

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2025 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	67690.59	31.12.2016	7976.55	7178.89	1761.86	8512.87	1056.55	18510.17	86200.76	20044.00	160.79	7489.75	66156.76

4/

50

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2025-26 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	30000.00	454.50	10169.28	33.90

वित्त नियंत्रक
निष्पक्ष विकास प्रक्रिया

अवैध निर्माण
(अधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॉलम 11+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के बाद रजिस्ट्रों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	16720	5900	843	11663	10	54	15	487	4	158	1	11450	92/2018-2019 107/2018-2019 109/2018-2019	03.01.2019 06.10.2018 06.10.2018


अनुपाल
अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल


अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता


वीरेन्द्र कुमार
अधिसायी अभियन्ता
प्रवर्तन सेल

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिह्नित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्जवादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्जवादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2025 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	123	0	123	0	26	74.25	0.00	0.00	0.00



मुख्य अधिकारी
सहायक अभियन्ता-तकनीकी



सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



आलोक रंजन
प्र० मुख्य अभियन्ता

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)					चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/ व्यय धनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग		अनुमोदित	निरस्त	कुल निस्तारित	कार्यवाही स्तर		आलोच्य माह तक प्राप्त	आलोच्य माह तक व्यय	प्रारम्भ कालोनिया	पूर्ण कालोनिया	
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)	5+6					प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0


 ऋतुपाल
 अवर अभियन्ता
 प्रवर्तन सेल


 अरुण कुमार
 सहायक अभियन्ता


 वीरन्द्र कुमार
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रवर्तन सेल


उद्यान

प्रारूप संख्या NF-36

वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025., तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			<08फुट (उंचाई)	≥ 08 फुट (उंचाई)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	150000	113450	0	113450	75.63


 20/12/25

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2025-26)

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिया (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	4	0	0	50	0	22	0.00	0.00	0	108654.18	52532.12	0	0.00	0.00


महेश कुमार गोयल
जल अभियन्ता-व्यक्ति


शुभिर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)


आनंद कुमार
प्र. मुख्य अभियन्ता

पृष्ठ संख्या

प्रारूप संख्या NF-39

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)						अधिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)		
		हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	3	0	11	515	0

↓
(प्रमोद कुमार)
वरिष्ठ अधिकारी

↓
विनय कुमार पन्ना
सहायक प्रभारी प्रशासन
मा0 दि0 प्रा0,
गाजियाबाद

O.S.D. (R)

प्रारूप संख्या NF-40

प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0



सुमित राघव
लिपिक
गाजि० विकास प्राधिकरण



कनिका कौशिक
विशेष कार्याधिकारी
गा०वि०गा० गाजियाबाद

7/1/25

प्रारूप संख्या NF-41

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीनवादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या (समस्त माह न्यायालयों में)	दाखिल रिक्चू की संख्या (समस्त माह न्यायालयों में)
		माह सर्वोच्च	माह उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	माह सर्वोच्च	माह उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	50	1145	5	50	1250.00	48	1086	4	48	1186.00	10	8	7	5	134	135


सूर्य लाल मेहता
वैयक्तिक लिपिक


सिद्धि अधिकारी
जजिआबाद

दि दि 25 25

प्रारूप संख्या NF-45

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/ निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभुति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी का चयन
1	Ghaziabad	श्री राजकुमार वर्मा	6	पूर्ण हो चुकी है।	0	माह अप्रैल 2017 से लागू	0	पूर्ण हो चुकी है।	हाँ	0

22-12-25
दिग्विजय भारत
सहायक प्रोग्रामर
गा0 वि0 प्रा0

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कैलम 6+पिछले माह का कैलम 7

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2025 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2025 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1 1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	23	0	0	0	6



महेश कुमार
सहायक अभियन्ता



सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



आलोक रंजन
प्र. मुख्य अभियन्ता

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रू० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू० करोड़ में)
			माह में व्यय (रू० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	300.00	4.54	101.68	15.25



अनिल कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



अनिल कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



आलोक रंजन
प्र० मुख्य अभियन्ता

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025								
क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चातुर वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	इंदिरापुरम	ई0डब्लू0 एस0	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेन्द्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	274 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-71	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	ई-52	90	30.08.2007	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-68	ई-68	68	10.03.2005	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		वैशाली	वैशाली	375	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 35	इंद्रापुरम भवन - 35	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम भवन - 70	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	भवन संख्या एल-13 एवं एल-146 के आवंटी द्वारा धनराशि जमा करायी गयी है।	0	0
		वैशाली	एल आई जी	52	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एम् आई जी 6 भवन	28.56	22.11.2011	02 आवंटी द्वारा कब्जा लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड एफ-25	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-76	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुवन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-107	ई-107	60	30.08.2007	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-65	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

राशि भूषण राय

(विधि अधिकारी)

महेश पाल सिंह
क0 लि0

महेश पाल सिंह
क0 लि0

महेश पाल सिंह
क0 लि0

महेश पाल सिंह
क0 लि0

महेश पाल सिंह
क0 लि0

महेश पाल सिंह
क0 लि0

महेश पाल सिंह
क0 लि0

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	29.7	08.03.2010	अनुबन्ध विलेख/रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90	23.07.2007	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-3	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/582	1582	02.06.1990	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		वैशाली	वैशाली	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम नेहरू नगर	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		कौशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-4	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	प्रताप विहार	78	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	नेहरू नगर	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-71	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	01.8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ए- 367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड मिनी एम् आई जी	मिनी एम् आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		नेहरू नगर थर्ड	एन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-29 प्लॉट	ई-29 प्लॉट	162	01.04.2006	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		कोयल एन्क्लेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	25.04.2013	दिनांक 14 -06 -2011 को नोटिस	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चातुर्वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है		
		इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2098 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा न करने के कारण आवंटन निरस्त	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई0 डब्लू एस0	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	31.79	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन -5 डी	72	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	345.4	02.01.1992	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-77 60	60	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0

महेश पाल सिंह
क0 लि0

अमित पाल
कनिष्ठ लिपिक
पवन कुमार सक्सेना

केन्द्रभूषण त्रिपाठी
अनुज कुमार
प्रमारी

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम्आई 0जी0	47.23	11.11.2005	निर्माणाधीन	0	0
		वैशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-33	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	10.01.2008	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाममिनी एम् आई जी	मिनी एम् आई जी	50.28	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	30.11.2013	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/878 प्लॉट	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	05.01.2012	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना	मधुबन बापूधाम योजना	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77,158,192सी	एम् आई जी	150	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0

महेश पाल सिंह

अमित पाल
कनिष्ठ लिपिकपत्रिका
कनिष्ठ लिपिक

अनुज

अनुज

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चातू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंद जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	22.08.2014	प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई -72	90	90	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		राजेंदर नगर	ई0डब्लू0 एस0	35.6	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78	60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0

महेश पाल सिंह
को लि0

अमित पाल
लिपिक

पवन कुमार सक्सेना
कनिष्ठ लिपिक

नरेश कौशिक
लिपिक

चन्द्रभूषण त्रिपाठी
लिपिक

अनुज कश्यप

राशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)
प्रभारी सम्पत्ति जोन-4/5

श्याम अवध चौहान
संयुक्त सचिव-3
भा0नि0, रा0नि0

एम0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव/प्रभारी
भा0नि0, रा0नि0

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति
स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2025-26 हेतु)

उदाहरण - $5+6^*$ = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025												
क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	472	2407	40.12	505	50	358	0	121	560

Ch

सुधीर कुमार गौतम
मुख्य अभियन्ता

Ad

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)

M

आलोक रंजन
प्रमुख अभियन्ता

Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कैलम 5+पिछले माह का कैलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2025-26 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	38.00	2.86	0.00	0.00


ऋतुपाल
 अवर अभियन्ता
 प्रवर्तन सेल


अनुराग कुमार
 सहायक अभियन्ता


वीरेन्द्र कुमार
 अधिसासी अभियन्ता
 प्रवर्तन सेल

प्रारूप संख्या NF-52

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा० अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा० अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	66		6	हाँ



अनिल कुमार नीगम
मुख्य अभियन्ता-तकनीकी



सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)



अनिल कुमार नीगम
प्र० मुख्य अभियन्ता

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025, तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1	-
		मधुबन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	5424	क्रियाशील	12	12	-
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1	-
		कोयल एन्वलेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0	-
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	-
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	0	0	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
		इंदिराकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	-
		भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	0	0	-
		ईंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	1550	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं।

मनिश कुमार नौतन

अध्यक्ष अभियन्ता-सहायक

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)

मनोज कुमार
प्र. मुख्य अभियन्ता

प्रारूप संख्या NF-55

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	488	6		1. Sh. Vineet Gupta, Computer Operator 2. Sh. Pankaj, Mali	5	0	82	78	0	82


(प्रमोद कुमार)
वरिष्ठ


विनय कुमार
सहायक प्रभारी प्रशासन
नगर सिविल प्रा.प.
गज़ियाबाद

31207 2125

प्रारूप संख्या NF-56

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Nov. 2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हाँ अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाइन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.in	0


 22.12.2025
 (अरुण कुमार)
 क0 ऑपरेटर

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 04-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हाँ अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हाँ अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	हाँ	हाँ	29.09.2022	14.10.2022	0

नियंत्रक
सहायक निरीक्षक अभिकरण
गौरीगढ़

विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0



संजय कुमार नीगम
सहायक अभियन्ता



सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता
(सकनीकी)



अशोक रंजन
प्रमुख अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04-12-2025

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2025 तक की कुल देयता (रू० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2025 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	अवशेष (3-4) (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अलोच्य माह तक की देयता (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रू० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	180112793.00	180112793.00	0	1732500.00	1514940.00	217560	217560

हस्ताक्षर
 दिनांक 04-12-2025

प्रारूप संख्या NF-61

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	4547	134203.15	4547	77852	4547	58760	216	53720	0	35700	0

अनुज कुमार
अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल

अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

वीरेन्द्र कुमार
अधिसायी अभियन्ता
प्रवर्तन सेल

प्रारूप संख्या NF-62

सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 22-12-2025

क्रम सं	आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वदों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वादों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	1	0	0	1	1. आदि बेस्ट क्लाउड-9, भूखण्ड सं० आर०सी०११/२ सेक्टर-१ वैशाली गाजियाबाद


 अनुज कुमार
 सहायक अभियन्ता
 प्रवर्तन सेल


 अनुज कुमार
 सहायक अभियन्ता


 वीरेन्द्र कुमार
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रवर्तन सेल

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	7.00	0.00	7.00	65.00	0.00	65.00	55.00	0.00	55.00	10.00	0.00	10.00


सूर्य लाल नौर्य
वैलनमान लिपिक


शशि भूषण राय
विधि अधिकारी
गा० वि० प्रा० गाजियाबाद

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1

रिपोर्टिंग माह: Nov.2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																Execution of Projects								रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025	
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/ Packages	Awarded cost of all tenders/ Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process		
																									(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C		
1	7B09800734023N0	7B09800734001236	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Bapudham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856	00	00	3878.77	4654.50	2757.20	01/10/2020	0	856	856	0		
2	09800734053N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528	00	00	2502.37	2830.39	249.17	04/07/2022	0	528	528	0		
3	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432	00	00	3000.00	3388.45	1137.00	30/09/2021	0	432	432	0		
4	09800734133N0	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Kharsa No. 1179 & 1180	10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252	00	00	0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	252	252	0		
5	09800734143N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147	00	00	0.00	0.00	0.00	30/10/2022	0	147	147	0		
6	09800734153N0	7B09800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	318	00	00	0.00	0.00	0.00	07/02/2022	0	318	318	0		
7	09800734183N0	7B09800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251	00	00	0.00	0.00	0.00	31/05/2023	0	251	251	0		
8	09800734203N0	7B09800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0		
A. कुमार गौड़ विकास विद्युता																										

मनोज कुमार गौड़
अवर अधिकारी

श्रीमती चैतन
सिखर अभियन्ता
ग्रां वि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																Execution of Projects						No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been Boated/Under Process
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded		
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
9	09800734213N0	7B09800734002134	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789/00	00		0.00	0.00	0.00	08/03/2022	0	789	789	0
10	09800734223N0	7B09800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946/00	00		0.00	0.00	0.00	09/06/2022	0	946	946	0
11	09800734273N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480/00	00		3885.60	3885.62	379.12	19/06/2022	0	480	480	0
12	09800734253N0	7B09800734002442	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493/00	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	1493	1493	0
13	09800734263N0	7B09800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyan - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312/00	00		0.00	0.00	0.00	24/03/2024	0	312	312	0
14	09800734243N0	7B09800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493/00	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	1493	1493	0
15	09800734193N0	7B09800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333/00	00		0.00	0.00	0.00	11/12/2021	0	333	333	0

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
									Self					Trough Bank Loan
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	994.20	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.00	994.20	662.80	1657.00
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	316.80	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	316.80	211.20	528.00
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	259.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	259.00	173.00	432.00
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	297.00	198.00	1542.00	0.00	0.00	0.00	2037.00	297.00	198.00	495.00
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	176.40	117.60	783.02	0.00	0.00	0.00	1077.02	176.40	117.60	294.00
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	190.80	127.20	1315.71	0.00	0.00	0.00	1633.71	190.80	127.20	318.00
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	150.60	100.40	850.00	0.00	0.00	0.00	1101.00	150.60	100.40	251.00
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	924.00	616.00	3400.05	0.00	0.00	0.00	4940.05	924.00	616.00	1540.00
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	1085.40	723.61	4401.35	0.00	0.00	0.00	6210.36	1085.40	723.61	1809.01

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																Execution of Projects						No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/ Packages	Awarded cost of all tenders/ Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded		
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh					Nos		Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)		16-A	16-B	16-C	
							& Vill. Saddiq, Ghaziabad																	
16	09800734283N0	7B09800734002077	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shri Ram North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	147	00	00	0.00	0.00	0.00	06/08/2024	0	147	147	0
17	09800734103N0	7B09800734629580	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihar	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	1200	00	00	5431.42	6067.98	200.18	19/06/2022	0	1200	1200	0

मनोज कुमार गोड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव नि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 3

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-12-2025

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
1	2	3	4	Nos	Nos					Nos	Nos				
				11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	856	0	0	856
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	528
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0	432
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	252	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	147	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	318	0	0	0	0	0	0	0	318	0	318
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	251	251	0	0	0	0
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मनोप कुमार गौड़ दीपिका चौधरी
अवर आयुक्त सहायक आयुक्त
गाँव विकास प्रारो

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
														Self
1	2	3	4	Nos	Rs. In Lakh							Rs. In Lakh		
				11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	535.80	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	535.80	357.20	893.00
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	1975.00	0.00	0.00	0.00	1975.00	0.00	0.00	0.00
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	187.20	124.80	515.00	0.00	0.00	0.00	827.00	187.20	124.80	312.00
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	1975.00	0.00	0.00	0.00	1975.00	0.00	0.00	0.00
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	199.80	133.20	6313.63	0.00	0.00	0.00	6646.63	199.80	133.20	333.00
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	176.40	117.60	783.02	0.00	0.00	0.00	1077.02	176.40	117.60	294.00
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaan	1200	1117.80	745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.00	1117.80	745.20	1863.00

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
				Nos	Nos					Nos					
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad												
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	0	0	0	0	0	789	0	0	789
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	0	0	0	0	0	946	0	0	946
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	480	0	0	0	0	0	48	48	432	0	0	432
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	0	0	0	1493	0	0	0	0
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	120	0	0	0	72	120	192	0	0	0	0
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	0	0	0	1493	0	0	0	0
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	333
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP	147	0	0	0	0	0	147	147	0	0	0	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed			
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
													Nos	Nos	
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad												
17	09800734103ND	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	0	0	0	0	0	48	48	1152	0	0	1152



Kumar Goud

कुमार गौड़
अभियन्ता



Viji

वीजि
सहायक
गाँव वि. प्र.



Aravind Kumar

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 4

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	0	0	00	0	Sh. Rajeev Kumar Singh Mob.-9568006414	0
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	216	109	0	131	0	17	473	163	310	0	0	00	0	Sh. Rajeev Kumar Singh Mob.-9568006414	0
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	159	109	3	149	0	10	430	153	277	0	0	00	0	Sh. Rajeev Kumar Singh Mob.-9568006414	0
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Kharsa No. 1179 & 1180	252	84	67	0	93	0	8	252	91	161	0	0	00	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	0
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	41	35	1	65	0	5	147	42	105	0	0	00	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	0
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP	318	144	79	2	83	0	10	318	105	213	0	0	00	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			component of PMAY-U at Ajnara																
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	373	159	7	226	0	21	786	257	528	0	1	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	286	659	0	1	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS	480	231	96	10	127	0	16	480	197	283	0	0	0	0	Sh. Rajeev Kumar Singh 0	

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Cenntal Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar															Mob.-9568006414	
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	0
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	0
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	0
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	155	73	0	69	0	8	305	93	212	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	0
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dweeling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Cenntal Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backword Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	Nos	Nos							Nos				Nos			
				11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad															Mo- 9958578002	
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	347	143	11	186	0	30	717	280	437	0	0	0/0		Sh. Rajeev Kumar Singh Mob.-9568006414	0

20/11/25
रजनीत सिंह
आर जमिंदार

रजनीत सिंह
आर जमिंदार


27/11/25
रजनीत सिंह
आर जमिंदार

प्रारूप संख्या NF-68

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - प्रगति विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-12-2025

Sr.No.	Authority Name	Total Unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	In Current Month						Till Current Month					
			Increase In Land Bank	Number of Layout approved	Number of Map for non-residential plot sanction	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning	Increase In Land Till month	Number of Layout approved Till month	Number of Map for non-residential plot sanction Till month	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	493	0.00	1	26	0	0	0.00	10.00	91	65	309	34	135.23


नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


राज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक
