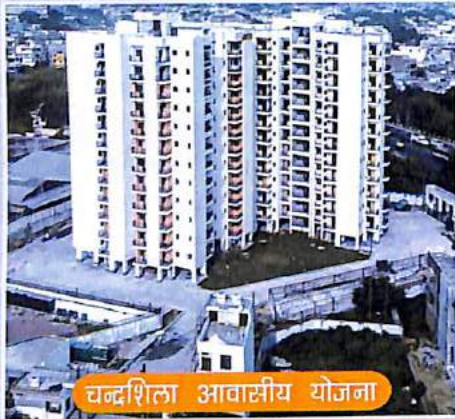




APRIL/ 2022

## MONTHLY PROGRESS REPORT

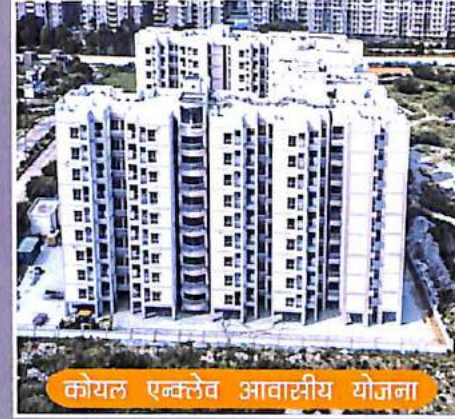
# Ghaziabad Development Authority



चन्दशिला आवासीय योजना



समाजवादी आवासीय योजना



कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना



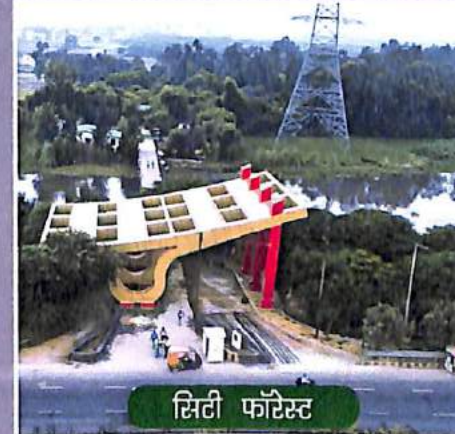
इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना



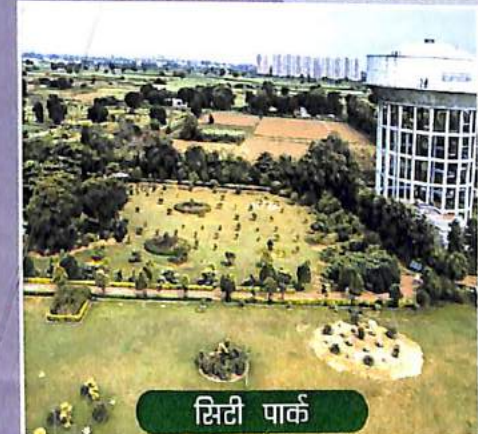
सचिव महोदय द्वारा वृक्षारोपण



लोहिया पार्क



सिटी फॉरेस्ट



सिटी पार्क

❀ हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर ❀

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
गाजियाबाद।

पत्रांक: /4/पी0ए0(टी0)/2022-23

दिनांक :


सेवा में,  
निदेशक,  
आवास बन्धु, उ0प्र0,  
लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र संख्या-8029/आ.ब.-1/निदेशक/2022 दिनांक 06 मई, 2022 के क्रम में नये प्रारूप-1 से 65 में मांगी गयी  
वॉछित प्रगति आख्या माह अप्रैल-2022 (डाउनलोड प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

  
20/5/22  
सचिव

## INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	अपर सचिव	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16.	अपर सचिव	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल मुखण्ड)	NF-17
17.	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्युनिटी फॅसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18.	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19.	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	लैण्ड बैंक	NF-20
20.	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21.	अपर सचिव	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाण पत्र' अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृति कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रभारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	सहा०अभि०/अवर अभि० तकनीकी	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुसंधान हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46


क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
42	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43	अपर सचिव	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)	NF-50
45	"	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	"	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी0ए0टी0पी0	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	विशेष कार्याधिकारी (एस0)	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	श्री अमरदीप कुमार, सहा0अभि0	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्तें, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	विशेष कार्याधिकारी (एस0)	अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण	NF-62
56	"	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी0ए0टी0पी0/अधिशाली अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65


### वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2022 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2022 से गत माह तक					चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	54649	53005	53329	0	1644	0	0	0	0	0	1	0	0	54649	53006	53329	0	1643	

  
रविश कुमार

  
वीननाथ  
अनुसंधान विभाग  
गजियाबाद

  
रविश कुमार गुप्ता  
मुख्य अभियन्ता

12

### वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2022 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2022से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12257	12518	48	1105	0	0	0	48	0	1	0	0	13362	12258	12518	48	1104

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 निदेशक  
 आवास-निर्माण  
 गणित-समाज-विकास-परिचरणा  
 गणित-समाज-विकास

*[Handwritten Signature]*  
 निदेशक  
 आवास-निर्माण  
 गणित-समाज-विकास-परिचरणा  
 गणित-समाज-विकास

*[Handwritten Signature]*  
 निदेशक  
 आवास-निर्माण  
 गणित-समाज-विकास-परिचरणा  
 गणित-समाज-विकास

*[Handwritten Signature]*

### वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12


रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2022 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2022से गत माह तक					चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	12717	10583	11489	144	2134	0	0	0	144	0	2	0	0	12717	10585	11489	144	2132	










निदेशक  
अनुसंधान  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद





### वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2022 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2022 से गत माह तक					चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	12717	10583	11489	144	2134	0	0	0	144	0	2	0	0	12717	10585	11489	144	2132	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सिवाजीराव  
अनुसूचित  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद

*[Handwritten mark]*

### वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कौलम 8+पिछले माह का कौलम 12

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2022 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2022से गत माह तक					चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8**+12*)	आवंटित HIG भवन (9**+13*)	पूर्ण भवन (10**+14*)	निर्माणाधीन भवन (11**+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	12032	8765	9061	0	3267	0	0	0	0	0	0	0	0	12032	8765	9061	0	3267	

डी० के० गुप्ता  
 सी० एम० एम०  
 उपायुक्त  
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
 गाजियाबाद

वित्तीय वर्ष 2022-23 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दि. 01.04.2022 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1011	0	0	0	2785	1011	0	0	1011

10/05/2022  
CC  
निर्माण विभाग

NBL  
10/05/2022  
(निर्माण विभाग)  
संस्थापक

निर्माण विभाग  
संस्थापक अभियन्ता

1

वित्तीय वर्ष 2022-23 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6\* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 6

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2022 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1011	0	0	0	2785	1011	0	0	1011

10/05/2022  
CC  
निर्माण विभाग

NBL  
10/5/2022  
(निर्माण कुशल)  
सहयोजक

10/5/2022  
निर्माण विभाग  
सहयोजक

10

### वित्तीय वर्ष 2022-23 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6 आलोच्य माह का कॉलम 4- पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: ..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 28/04/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2022 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक उपलब्ध कुल भवन (3+8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(J.J.H) योग	1954	0	0	0	2776	1954	0	0	1954

*[Signature]*  
30/4/2022  
CC

*[Signature]*  
30/4/22

*[Signature]*  
30/4/22  
योगेश कुमार  
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल

*[Signature]*  
योगेश कुमार  
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल

*[Signature]*

वित्तीय वर्ष 2021-23 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 1+6 आलोच्य माह का कॉलम 4+ पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: ..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 28/04/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2022 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ज.ड.ए.योग	1954	0	0	0	2776	1954	0	0	1954

30/4/2022  
CC

30/4/2022

30/4/22  
योगेश कुमार  
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल

30/4/22  
योगेश कुमार  
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल

30/4/22

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कौलम 8+पिछले माह का कौलम 12

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+13*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Ghaziabad	10850	0	22,2339	0	5,005	0	1440	0	2056	0	7354	10850	0	0

09/05/2022

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्रम सं	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	12	0	12	0	7354	0	12	0	6	0	2785	0	2785



प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	1.04.2020 को सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

10/05/2022  
C/C

12/5/22

योगेश कुमार  
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल

N18L  
12/5/22  
(निशांत कुमार)  
सर्वो अधिकारी

विशेष प्रभारी  
अभिकरण निदेशिका

07

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	1.04.2020 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चार वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

## मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से )

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण						अनावंटित रखने का कारण	
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्जा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्जा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)		वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1415	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जानी है।



RK  
शरदेश कुमार गुप्ता  
मुख्य अभियन्ता



## मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण					अनावंटित रखने का कारण		
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्ज़ा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्ज़ा प्रदत्त		भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1415	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जानी है।

  
 अधिकारी का नाम  
 अधिकारी का पता

Rk  
 राकेश कुमार गुप्ता  
 मुख्य अधिकारी

Rk

## हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11\* = आलोच्य माह का कॅलम 10 + पिछले माह का कॅलम 11

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रैरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकाशकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आर्चादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आर्चादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़) (10+11*)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चट्टा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	UPRERAPRM5538	21-05-2005	07-10-2009	4494.31	2866.99	202.17	0.00	186.843	3490.00	10	26811	1019.22	1019.22	31/07/2014	16.00	3074.72
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इफ्रा प्राइवेट लि०	UPRERAPRM7375	21-05-2005	11-05-2011	4312.99	684.07	309.69	0.00	180.091	827.65	9	21580	373.43		030/06/2016	1.60	940.75

Dr

Dr

Dr

Dr

## हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIGके अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति		आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल			
								क्षेत्रफल	भौतिक											दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग				दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Ghaziabad	मैसर्स उम्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	50	44	53	50	44	593	28	10	8	10	15	2120	13137	13137	8330	8330	576	0	684	1178	648	517	387.15	0	5450
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0	144

## इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण: 3+4 = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (कमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29-05-2006	02-03-2007	360	257.58	29.4	9.25	316	0	0	0	0	10-12-2013	0.00	1261.50
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ5463 & OTHER	29-05-2006	05-09-2007	140.63	114.08	15.62	0	137	0	0	0	0	14-09-2015	0.50	368.38
		मैसर्स अग्रवाल एसो० प्रमोटर्स लि०	UPREARPRJ1498 & OTHER	29-05-2006	05-07-2007	185	184.69	8.64	8.63	184.69	0	0	0	0	10-07-2013	1.88	422.87
		मैसर्स एम्मार एम० जी० एफ० लैंड लि	UPREARPRJ3055 & OTHER	09-12-2008	13-10-2013	117.68	75.00	0.46	0.2496	75.00	1	0	0	0	10-12-2013	0.90	223.28
		मैसर्स एस० एम० वी० एजेसीज प्रा० लि०	UPREARPRJ5719 & OTHER	29-05-2006	13-02-2007	300	186.65	3.48	0	226.5	0	0	0	0	30/09/2011 11/06/2018	0.00	454.40
		मैसर्स सामग कंस० लि०	UPREARPRJ3882 & OTHER	29-05-2006	23-02-2007	72.9	68.88	0.41	0	72.9	0	0	0	0	27-11-2015	0.00	396.50
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा० लि०	UPREARPRJ5633 & OTHER	29-11-2006	22-10-2007	91.6	67.69	5.66	0.3158	79.75	0	0	0	0	10-12-2013	0.00	461.30
		मैसर्स साहनी बििल्डर्स प्रा० लि०	0	0	0	200.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00

## इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)					परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)	
			सड़क	वाटर सप्लाय	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति		आवंटित		बंधक भूमि का क्षेत्रफल		अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल
								क्षेत्रफल	भौतिक										दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Ghaziabad	मैसर्स कासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	63	63	63	63	50	38.58	13	0	0	0	0	0	2214	2214	1575	1575	496	468	0	0	496	466	0	0	15000
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	392	392	318	318	128	32	0	0	0	0	0	0	2960
		मैसर्स सामग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.50	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	0	0	360	360	360	360	0	0	899
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0	65	83	65	65	65	4.30	0	0	0	0	0	0	303	303	224	224	167	74	0	0	224	116	0	0	2295
		मैसर्स साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	100	100	100	100	100	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	0	144	188	96	152	240	0	0	1970
		मैसर्स एम्मार एंम0 जी0 एंफ्रा0 लैंड लि	70	80	85	85	90	10.38	3	0	0	0	0	0	593	593	363	363	24	24	205	205	0	0	0	0	1093
		मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	63	48	57	57	48	17.10	1	0	0	0	0	0	450	450	270	270	0	0	264	34	244	272	0	0	2100



## सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2022 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
							संख्या(7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	7	0	0	7	0	0	0	7	117.85

12  
09/05/2022

कुमार)  
वरिष्ठ सहायक  
जी०डी०ए०

10/05/2022  
वीनासाधु  
अनुसंधान  
गणित/सांख्यिक विभाग  
गणित/सांख्यिक विभाग

10/05/2022

10/05/2022

जी०डी०ए०  
वरिष्ठ सहायक

12

सम्पत्ति विस्तारण अनावासीय व्यावसायिक आवासीय श्रेणी के तहत प्रती प्रकल्प के तहत प्रीमिटी फैसिलिटी सम्पत्तियों का विवरण

आलोच्य माह: अप्रैल 2022 तक पिछले माह का आरंभ 5

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक रिपोर्टिंग तिथि: 10/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2022 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में)
							संख्या (7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	390	0	0	390	0	0	0	390	64893.59
1	Ghaziabad	390	0	0	390	0	0	0.00	390	64893.59

*(Handwritten Signature)*  
10/5/22  
व-6

(प्रभात कुमार)  
वरिष्ठ सहायक  
जी०डी०ए०

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Signature)*  
पी० त्रिपाठी  
अपर सचिव

*(Handwritten Mark)*

## सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटि द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है	प्रारम्भ से 31.03.2022 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	5014	4811	7920	7134	42	11987	74	396.42

11/05/22  
HC

11/05/22  
HC

11/05/22  
HC

11/05/22  
HC

11/05/22  
HC

11/05/22  
HC

## लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कालम 13+पिछले माह का कालम 14

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022



क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2022 की स्थिति							वर्ष 2022-23 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)							अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित(हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	3899.13	3807.24	3657.50	3347.32	2099.88	1950.06	149.74	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	149.74	459.92


दुर्गेश सिंह
   
 तहसीलदार
   
 गाजिओ विकास प्राधिकरण

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/ सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00
		सर्दीकनगर ख0 सं0 1013 . 1014	208.00	राज नगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0.00


  
 डायरेक्टर  
 विकास विभाग  
 गांधी विकास विभाग





## सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति



रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2022 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ghaziabad	407	192	599	60	211	0	211	388	0

  
11/5/22  
AC

  
11/05/22  
AC

  
11/05/22  
AC  
कीर्ति कश्यप  
प्रमुख, ए.ए.ए.  
महानगरपालिका, गजियाबाद

  
11/05/22  
रघवीर सिंह  
प्रभारी सहायक  
  
11/05/22




आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक रिपोर्टिंग तिथि: 05.05.2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2022 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	141	147	1598	1739	101	1275	5	459	0	0	0	Nil

  
T.P

  
UPobpcas  
06/05/2022





अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 05/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2022 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	33	20	228	261	2	82	8	171	0	0	0	Nil

  
T.P

 06/05/2022







ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2022 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	2	3	21	23	0	5	1	17	0	0	0	Nil



  
05/06/2022





भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण 4+5\* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक रिपोर्टिंग तिथि: 05/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2022 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	2	2	26	28	0	3	0	25	0	0	0	Nil

  
T.R

  
06/05/2022




अभिकरण द्वारा विकसित या अज्ञात निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अंतर्गत 300 वर्ग मीटर


आवासीय भूखण्डों के मानचित्र अप्रति की स्थिति

उदाहरण - 2022-23 के आवासीय भूखण्डों के पिछले माह के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र अप्रति की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Apr, 2022 तक रिपोर्टिंग तिथि: 05/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31.03.2022 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	90	125	1339	1429	89	936	493

  
T.P

  
06/05/2022



निर्गत-पूर्णता-प्रमाणपत्र का विवरण  
(ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7 = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Apr. 2022 तक रिपोर्ट की तिथि: 13.05.2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 31.03.2022 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2022 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2022 तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र (6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र (9+10*)	पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	2253	221	2032	7	7	2039	0	0	2039

### वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9\* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	31.03.2022 को संचित धनराशि (रू.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	8837.99	38178.00	0.00	0.00	47015.99	3876.50	3876.50	3214.19	120.61	648.75	16.74

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten mark)*

## विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रु० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां(रु० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रु० लाख)		शामन (रु० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा वेटरमेंट चार्जेज ;रु० लाख		अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)		कुल अर्जित आय (रु० लाख)	
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (5+7+9+12+14+16)	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (6+8+10+13+15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Ghaziabad	21428.82	113436.00	1156.35	2057.00	378.13	564.69	0.00	0.00	31.12.2016	0.00	0.00	1409.46	244.64	270.25	1010.17	3214.19	3876.50

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कैलम 13+पिछले माह का कैलम 14

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2022 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शामन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	23542.24	31.12.2016	0	0	282.34	244.69	0	527.03	24069.27	31210.00	199.57	199.57	-7140.73

*[Handwritten signatures and initials]*



*[Handwritten mark]*

## निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2022-23 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में)	चार वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	32000.00	1814.78	1814.78	5.67





## अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12\* = आलोच्य माह का कालम 11+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर		वित्तीय वर्ष 2022-23 में की गयी कार्यवाही की प्रगति											
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2022 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2022 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	14170	4746	66	9490	33	33	71	71	39	39	0	9418	48/17 12.01.2018 99/20.12.2018 16/08.06.2018	21.02.2019 18.08.2020 12.07.2018

धनंजय सिंह/अजय मेहरोत्रा  
अवर अभियन्त/सहायक अभियन्ता  
(नोडल) प्रवर्तन नोडल

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कालम 5+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिह्नित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वार्दों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वार्दों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2022 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	123	0	123	0	26	73.97	0.00	0.05	0.05

रविंद्र कुमार गुप्ता  
निदेशक अभिकरण (तकनीकी)

Rakesh Kumar Gupta  
मुख्य अभिकरण

DR


## अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Apr, 2022 तक रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिसकी नोटिस निर्गत की गयी (संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिनमें आवेदन पत्र प्राप्त हुये (संख्या)			वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)					चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/व्यय धनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)	
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग		अनुमोदित	निरस्त	कुल निस्तारित	कार्यवाही स्तर	आलोच्य माह तक प्राप्त	आलोच्य माह तक व्यय	प्रारम्भ कालोनिया	पूर्ण कालोनिया			
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)	5+6		(संख्या)	(संख्या)	(संख्या) (9+10)	प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या	(रू. लाख)	(रू. लाख)	संख्या	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	327	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0

  
 राजेंद्र सिंह  
 अवर कमिश्नर  
 (नोडल)  
 राजेंद्र सिंह  
 राजेंद्र सिंह  
 प्रवर्तन नोडल

  
 राजेंद्र सिंह

  
 राजेंद्र सिंह

## वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	पीछे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			<08 फुट (उंचाई)	≥ 08 फुट (उंचाई)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	130000	0	0	0	0.00

*[Signature]*  
10/5/2022

*[Signature]*  
10/5/22

*[Signature]*  
10/5/22

*[Signature]*

## रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2022-23)

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	केचमेन्ट एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	4	0	0	100	2	2	2.00	0.00	0	1155.00	557.86	0	0.00	0.00

Dr. Rakesh Kumar Gupta  
मुख्य अभियन्ता (तकनीकी)


Dr. Rakesh Kumar Gupta  
मुख्य अभियन्ता

Dr.


## शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)					अधिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)			
		हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा० मुख्या मंत्री संदर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	3	0	22	223	0

आलेख नं० (F) 4/2022  






दीपिका  
 आचार्य  
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
 गाजियाबाद



दिनांक  
 09/05/2022



## प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0

JK  
18/5/2022  
P.A to OSD.

NIL.

- G.C.  
18/5/2022  
vs  
दीनानाथ  
अनुसंधान  
याद विभाग प्राधिकरण  
गजियाबाद

JK  
18/5/22

JK

## माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीनवादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या समस्त मा10 न्यायालयों में)	दाखिल रिव्यू की संख्या (समस्त मा10 न्यायालयों में)
		मा10 सर्वोच्च	मा10 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	मा10 सर्वोच्च	मा10 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	33	995	0	37	1065.00	32	960	0	37	1029.00	30	30	8	8	116	141

He

12


3




## ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्वोरमेंट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	नगर एवं अधिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजिटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अधिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अधिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	श्री मानवेन्द्र सिंह	7	पूर्ण हो चुकी है	0	माह अप्रैल 2017 से लागू	0	पूर्ण हो चुकी है	हां	0

  
 10/05/2022  
 CDIGVIJAY  
 BHARAT AP

  
 मानवेन्द्र कुमार सिंह  
 अधिशासी अभियन्ता  
 जोन-

72

### अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7\* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2022 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2022 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	22	0	0	0	7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
शकेश कुमार  
मुख्य अभियन्ता


*[Handwritten mark]*

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5\* आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रू० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू० करोड़ में)
			माह में व्यय (रू० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	320.00	18.15	18.15	5.67


  
 डी० सी० आर०  
 सहायक अभियंता (संरचना)

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9\* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चात् वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	विशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	ज्ञानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए, 182, 183	69.33	21.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन -5 डी	72	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		कोयल एन्क्लेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	01.8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम भवन - 70	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	06.08.2015	दिनांक 14 -06 -2011 को नोटिस	0	0
		प्रताप विहार	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम् आई जी	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई0 डब्लू0 एस0	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	31.12.2009 रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-88	60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		प्रताप विहार	के ए- 367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	के ए- 380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	345.4	07.10.1985	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-29 प्लॉट	162	01.04.2006	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंदिरापुरम	ई0डब्लू0 एस0	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/591	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-107	60	30.08.2007	रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	प्रताप विहार	90	23.07.2007	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंदिरापुरम भवन - 35	ई0डब्लू0 एस0	19.5	15.01.1990	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		नेहरू नगर थर्ड	एन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		पटेल नगर	आवासीय भूखंड	170	02.05.1985	अतिक्रमण के कारण स्वगन आदेश प्राप्त है	0	0
		प्रताप विहार	के-78	83.63	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	29.7	08.03.2010	अनुबन्ध विलेख/रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		विशाली	1/आर - 07	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-77	60	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	ई-52	90	30.08.2007	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/314	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/837सी	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		विशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/582	1582	02.06.1990	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/883	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-67	60	30.08.2007	दिनांक 15-09-2018 को बकाया धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	एम् आई जी 8 भवन	28.56	22.11.2011	अनुबंध विलोप किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	90	10.03.2005	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-72	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77,158,192सी	एम् आई जी	77	13.12.1992	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	841 ई0 डब्लू एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलोप किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78	60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		राजेंदर नगर	ई0डब्लू0 एस0	35.6	25.06.2009	न्यायालय में वाद विचाराधीन	0	0
		संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	मिनी एम् आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	30.11.2013	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

संजय कुमार भट्ट  
वरिष्ठ सहायक

दीपक

दीपक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चासु वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/887	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	111.57	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए. एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/878 प्लॉट	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		वेशाली	वेशाली	375	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन -69/4	209.83	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वेशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	160 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2098 ए. एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा न करने के कारण आवंटन निरस्त	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध वितेख नहीं कराया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 सी	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	160 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।	0	0
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण 0	0	0
		वेशाली	एल आई जी	52	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वेशाली	वेशाली	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वेशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		संजय नगर	एल आई जी	22	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/550	111.58	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	09	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0

रजिस्ट्रार  
परिचय सहायक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	04-05-2009	प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-33	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	111.56	15.09.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	790	27.09.2016	निर्माणाधीन पैमेंट शेड्यूल जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349.86	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-48	90	30.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		कौशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		कौशाम्बी	ए - 245	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम0आई 0जी0	47.23	16-09-2015	निर्माणाधीन	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0

कुमाय भटनागर  
सहायक

सी0 पी0 त्रिपाठी  
अपर सचिव



## आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

## रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	दिकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	400	400	6.67	84	8	60	1	20	108

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp:   
R.K.   
उपस्थित   
मुख्य अधिकारी

Handwritten signature.

**आवास एवं शहरी नियोजन विभाग**  
**रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति**  
**स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)**

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	400	400	6.67	84	8	60	1	20	108


  
 R/o  
 अतिरिक्त सहायक सचिव  
 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग




Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2018-20 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	38.00	1.31	0.00	1.55


  
 (सिडल)





अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा०अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा०अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77		7	हाँ

डॉ० एन० एम०  
अधीनस्थ अभियन्ता (अवर)


Ru  
रविश कुमार गुप्ता  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी


R

## अहस्तान्तरित टंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	टंक सीवर		टंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1		जल निगम द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण
		स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1	-
		मधुबन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12	-
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1	-
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0	-
		इंद्रापुरम	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8	-
		इंदिराकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	-
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	1200	क्रियाशील	2	1	योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं।
		राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	-
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	-

  
 अधिकारी (तकनीकी)

  
 प्रमुख अधिकारी



## महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Ghaziabad	170	2021	14.07.2005	162	33	32	11	0	0	0	11	0	6

*[Signature]*  
P/M  
3/2/2022

*[Signature]*  
A.P.G./Bh

*[Signature]*  
D/MAH  
(K. Singh)

*[Signature]*  
D/MAH

*[Signature]*  
(Sharma)

*[Signature]*  
D/MAH  
(R.M. Gami)

*[Signature]*  
T.P

*[Signature]*

## अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	681	9		1. Shri Naveen Kumar. Varisth Lipik 2. Shri Chote Singh, Workmate	7	57	25	20	0	25

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
 दैनिकीय  
 अनुसन्धित  
 ग्हाज़िआबाद विभाग प्रमुख

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबन्ध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हों अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.in	0

*pm*  
मानवेन्द्र कुमार सिंह  
अधिसासी अभियन्ता  
जोन.



*TR*



## अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के सत्यापित बैलेन्स-शीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	हाँ	हाँ	15.01.2021	01.03.2021	0







## विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0

  
 राकेश कुमार गुप्ता  
 मुख्य अभियन्ता

  
 \_\_\_\_\_

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति



रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2021 तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2021 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	155498557.00	155498557.00	0	1130138.00	1130138.00	0	0

## Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	4547	108174	4547	72888	216	58760	216	53720	0	35700	0

  
  
 सहायक निदेशक  
 सहायक निदेशक  
 प्रवर्तन नोडल





## सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Apr,2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्रम सं	आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वदों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वादों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	3	0	02	01	1. शिप्रा-सृष्टि, अहिंसाखण्ड-1, इन्दिरापुरम 2. शिप्रा-विष्ट, अहिंसाखण्ड-1, इन्दिरापुरम 3. रामप्रस्था ग्रीन पार्केट, वैशाली, गाजियाबाद

## महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कॅलम 13+पिछले माह का कॅलम 14

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	126.00	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00

He

मु. प्र. वि. 2022

12

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 3

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units							Completion of Dwelling units with infrastructure			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
						Nos	Nos	Nos	Nos	Nos					
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	96	66	70	0	384	616	240	0	0	0
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	432	0	48	48	0	0	96	0	0	0	0
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	09800734083N0	Ghaziabad	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	24	0	77	331	0	0	408	0	0	0	0
7	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	720	144	240	96	0	0	480	0	0	0	0
8	09800734113N0	Ghaziabad	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0
10	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	0	0	147	0	147	0	0	0	0
11	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	38	0	280	0	318	0	0	0	0
12	09800734163N0	Ghaziabad	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2280	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	588	0	201	0	789	0	0	0	0
17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	271	0	675	0	946	0	0	0	0
18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0	0	480	0	0	0	480	0	0	0	0
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	333	0	0	0	333	0	0	0	0
24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: Apr.2022..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with (17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
				Nos	Rs. In Lakh							Rs. In Lakh		
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	897.60	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1496.00	897.60	598.40	1496.00
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	2160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	09800734083N0	Ghaziabad	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	259.20	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	259.20	172.80	432.00
7	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	09800734113N0	Ghaziabad	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	1800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	151.20	100.80	695.91	0.00	0.00	0.00	947.91	151.20	100.80	252.00
10	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	88.20	58.80	257.00	0.00	0.00	0.00	404.00	88.20	58.80	147.00
11	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajjara	318	190.80	127.20	592.00	0.00	0.00	0.00	910.00	190.80	127.20	318.00
12	09800734163N0	Ghaziabad	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)		
						Central Grant	UBI/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary							
														Self	Trough Bank Loan
Nos	Rs. In Lakh							Rs. In Lakh							
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	473.40	315.60		147.39	0.00	0.00	0.00	936.39	473.40	315.60	789.00
17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	567.60	378.40		3200.00	0.00	0.00	0.00	4146.00	567.60	378.40	946.00
18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	199.80	133.20		285.58	0.00	0.00	0.00	618.58	199.80	133.20	333.00
24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अलोक रंजन  
अधिव अधियन्ता

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1

रिपोर्टिंग माह: Apr, 2022, तक रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

S. No.	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC													Execution of Projects											
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Stums involved in the project	Name of Stums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been Notted/Under Process	
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh											Nos	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)								
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C	
1	7B09800734023N0	7B09800734001236	Faizabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Bapudham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	356.00	9241.00	1712.00	856	00		3876.77	4654.50	2649.44	01/10/2020	0	856	856	0	
2	09800734053N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niweds	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528	00		2502.37	2830.39	0.00	0	0	0	528	528	0
3	09800734063N0	7B09800734001698	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	9/26/2018	8917.53	2160.00	1440.00	2437.53	2880.00	1440	00		5872.11	6432.41	0.00	0	0	0	0	0	0
4	09800734073N0	7B09800734001699	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Bapudham Yojana	9/26/2018	31967.89	3240.00	2160.00	22247.89	4320.00	2160	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
5	09800734083N0	7B09800734001700	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Bapudham Yojana Pocket F	9/26/2018	10054.92	990.00	660.00	7084.92	1320.00	660	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daama	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432	00		3000.00	3388.45	712.20	30/09/2021	0	432	432	0	
7	09800734103N0	7B09800734001702	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pralap Vihar	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	1200	00		5431.42	6067.98	200.18	19/06/2022	0	0	1200	1200	

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects						No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process		
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slms Involved in the project	Name of Slms Involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project			Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded
								(DD-MM-YY)																
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
8	09800734113NO	7B09800734001703	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	9/26/2018	20361.17	2700.00	1800.00	12261.17	3600.00	180000	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
9	09800734133NO	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Kharna No. 1179 & 1180	10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	25200	00		0.00	0.00	0.00	09/07/2021	0	252	252	0
10	09800734143NO	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	14700	00		0.00	0.00	0.00	30/10/2021	0	147	147	0
11	09800734153NO	7B09800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	31800	00		0.00	0.00	0.00	07/02/2022	0	318	318	0
12	09800734163NO	7B09800734002079	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	1/30/2019	34779.00	3420.00	2280.00	24519.00	4560.00	228000	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
13	09800734173NO	7B09800734002078	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Nirwal, Ghaziabad	1/30/2019	1793.42	432.00	288.00	497.42	576.00	28800	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	288	0
14	09800734183NO	7B09800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya, Vill. Paranda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	25100	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	251	0

अतोक रजन  
अधिक अभियन्ता

जाति 2880 2021  
जाति 2880 2021

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/ Packages	Awarded cost of all tenders/ Packages	Total payments made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh										No	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)		16-A	16-B	16-C				
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
15	09800734203NO	7B09800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1860.058	1702.35	873	00		0.00	0.00	0.00	0	0	873	0	0
16	09800734213NO	7B09800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	1777.98	1538.55	789	00		0.00	0.00	0.00	08/03/2022	0	789	789	0
17	09800734223NO	7B09800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migson Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946	00		0.00	0.00	0.00	09/06/2022	0	946	946	0
18	09800734233NO	7B09800734002097	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	1/30/2019	4653.12	444.00	296.00	3335.92	577.20	296	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
19	09800734273NO	7B09800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480	00		3885.60	3885.62	262.09	19/06/2022	0	480	480	0
20	09800734243NO	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00		0.00	0.00	0.00	0	0	1493	0	0
21	09800734263NO	7B09800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Anandgram - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312	00		0.00	0.00	0.00	0	0	312	0	0

अधीन अमितान्तः

S. No.	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC															Execution of Projects								
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	U.I.R Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been Slated/Under Process
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh										Nos	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)								
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
22	09800734243N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SCS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00		0.00	0.00	0.00	0	0	1493	0	0
23	09800734193N0	7B09800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Omne Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333	00		0.00	0.00	0.00	11/12/2021	0	333	333	0
24	09800734283N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	147	00		0.00	0.00	0.00	0	0	147	0	0
25	09800734293N0	7B09800734002535	Ghaziabad	Ghaziabad	M/S R B Infrestate Pvt. Ltd. (Ghaziabad Development Authority)	Pvt Developers	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	8/29/2019	3064.2293	598.50	399.00	1268.9288	797.8005	399	00		0.00	0.00	0.00	0	0	399	0	0

M

D


12


08/05/2022, 14:27

### Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 4


रिपोर्टिंग माह: Apr,2022 तक रिपोर्टिंग तिथि: 09/05/2022

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSM/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units								Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender					
					Nos	Nos				Nos				Nos						
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	0	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan Mo-9582716810	0
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sh. Manvindra Singh Mo-8588830171	0
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan Mo-9582716810	0
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan Mo-9582716810	Request send to Principal Secretary, Awast to Afford the excessive Loading of construction cost by Govt Or cancellation of the project vide Letter No. 14/4/EEZONE-3/2021 Date 22-05-2020 due to non availability of fund in GDA

  
 19/05/2022  
 cc  
 विनोय कुमार  
 कनिष्ठ अधिकारी

  
 22/5/22  
 मोहित कुमार  
 सहा. प्रशासकीय अधिकारी

M/S  
 12/5/22  
 मिश्रा (3/12)  
 सह. प्रशासकीय

  
 विपिन कुमार  
 सहा. प्रशासकीय





12	09800734163N0	Ghaziabad	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
✓ 16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	136	58	0	101	0	6	301	79	221	0	1	0	0	PVT Developers	0
✓ 17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	293	652	0	1	0	0	PVT Developers	0

*[Signature]*  
10/5/22

*[Signature]*  
12/5/22  
योगेश कुमार  
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वार्ड जेन

N/8L  
12/5/22  
(निर्धारित प्रमाण)

*[Signature]*  
विमिन कुमार  
सुपरवाइजर

18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kuntumbh, Ghaziabad	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	Project have been cancelled by V.C. order dated 19-11-2019 hance No- of Eligible EWS Unit=0
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyan - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	21	11	0	5	0	3	40	7	33	0	0	0	0	0	PVT Developers	0

*[Signature]*  
19/05/2022  
विपिन कुमार  
कोषाधिकारी

*[Signature]*  
12/5/22  
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल  
विपिन कुमार  
कोषाधिकारी

N18L  
12/5/22  
विपिन कुमार  
कोषाधिकारी

24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0

*Handwritten signature*  
 10/05/2022  
 10/05/22

*Handwritten signature*  
 12/5/22  
 12/5/22

*Handwritten signature*  
 NISL  
 12/5/22  
 12/5/22

*Handwritten signature*  
 12/5/22  
 12/5/22
